

**ZPRÁVA O REALIZACI OPATŘENÍ
SOUHRNNÝCH AKČNÍCH PLÁNŮ
HOSPODÁŘSKÉ
RESTRUKTURALIZACE**

**Ústeckého, Moravskoslezského
a Karlovarského kraje**

1. 1. 2023 – 31. 12. 2023



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Obsah

1. Úvod	3
2. Strategie RE:START	7
2.1 Aktualizace Strategického rámce hospodářské restrukturalizace ÚK, MSK a KVK	7
2.2 Implementační zásady	7
2.3 Aktuální stav naplňování akčních plánů.....	9
2.4 Realizace opatření	10
2.5 Indikátory.....	14
2.6 Bariéry a rizika další realizace	15
3. Mechanismus spravedlivé transformace	16
3.1 Plán spravedlivé územní transformace.....	16
3.2 TSI projekt na implementaci spravedlivé transformace:	17
3.3 Hodnocení Plánu spravedlivé územní transformace	17
4. Závěr.....	23
5. Výhled na období 2024	24
Seznam použitých zkratk.....	25
Seznam tabulek a grafů.....	26
Přílohy	26



1. Úvod

Předložená Zpráva o realizaci opatření Souhrnných akčních plánů hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 (dále jen „Zpráva o realizaci“, „ÚK“, „MSK“ a „KVK“) se vztahuje k pěti Souhrnným akčním plánům Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje (dále jen „Akční plány“), které byly schváleny usnesením vlády ČR. Dále zpráva popisuje činnosti výkonného týmu RESTART za období roku 2023.

Agendy výkonného týmu RESTART v roce 2023:

- Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje (dále jen „Strategie RE:START“)
- Příprava aktualizace Vstupní analýzy a Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje (dále jen „SR“)
- Mechanismus spravedlivé transformace (dále jen „MST“)
 - Asistence pro implementaci OPST
 - Poradenství v rámci TSI projektu
 - III. Pilíř MST
- Koordinace aktivit týmu RESTART s programem Spravedlivé transformace
- Zapojení do Platformy spravedlivé transformace.

Výkonný tým Strategie RE:START – oddělení 186 – RESTART

Výkonný tým Strategie RE:START působí na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR (dále jen MMR) v rámci Odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení, oddělení 186 – RESTART.

Personální záležitosti

Od 1. 1. 2023 bylo zrušeno 5 FTE pro pracovní pozice koordinační, projektový a programový pracovník. Zároveň od tohoto data nebyla obsazena pozice Ministerského rady – Konzultanta pro Ústecký kraj a vedoucího oddělení.

Pozice Ministerský rada – Konzultant pro ÚK byla obsazena k 1. 2. 2023. Pozice Vedoucího oddělení byla obsazena k 15. 3. 2023 pracovníkem působícím dosud na pozici Ministerského rady – Konzultanta pro Moravskoslezský kraj.

S obsazením pozice Vedoucího oddělení se uvolnilo služební místo Ministerský rada – Konzultant pro Moravskoslezský kraj v regionální kanceláři Tato pozice byla obsazena k 15. 5. 2023.

Na období 1. 1. 2023 – 31. 12. 2028 je činnost oddělení RESTART **financována v rámci Technické pomoci OP Spravedlivá transformace**, název projektu: RE:START III, registrační číslo projektu: CZ.10.04.01/00/22_004/0000001. Konkrétně se jedná o tyto pozice:

- Vedoucí oddělení RESTART,
- Ministerský rada – Konzultant pro Moravskoslezský kraj,
- Ministerský rada – Konzultant pro Karlovarský kraj,
- Ministerský rada – Konzultant pro Ústecký kraj,
- Ministerský rada – Konzultant problematiky uhelných regionů.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V roce 2023 byla vykonána úřednická zkouška třemi zaměstnanci ve služebním poměru (*Vedoucí oddělení, Konzultant pro Ústecký kraj a pro Moravskoslezský kraj*) v oboru služby 38 – Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy.

Organizační zajištění, účast na jednáních

Členové týmu RESTART absolvovali prezenční nebo on-line formou celkem 323 jednání, z toho 42 z nich sami organizovali.

Členové týmu RESTART se pravidelně účastnili jednání, kde jsou členem nebo stálým hostem ve výborech, komisích, odborných platformách či pracovních skupinách. Jedná se např. o:

- Monitorovací výbor Operačního programu Spravedlivá transformace (dále „OPST“)
- Tematické pracovní skupiny OPST
 - Podnikání; Výzkum a inovace; Energetika; Digitalizace; Obnova území; Oběhové hospodářství; Trh práce; Vzdělávání
- Výběrová komise ŘO OPST 2021 - 2027
- Pravidelné koordinační schůzky s MŽP a kraji
- Řídicí výbor pro implementaci Spravedlivé transformace
- Řídicí výbor technické asistence pro III. pilíř MST
- Řídicí výbor technické asistence pro energetické komunity
- Pracovní skupina pro bezuhelnou energetiku Moravskoslezského kraje
- Vodíková platforma Ústeckého kraje
- Výzkumně-vzdělávací platforma Ústeckého kraje
- ITI Ústecko-chomutovská aglomerace: Projektový tým
 - Pracovní skupina Doprava a infrastruktura
 - Pracovní skupina Životní prostředí
 - Pracovní skupina Ekonomika
 - Pracovní skupina Lidské zdroje
 - Pracovní skupina Kultura a cestovní ruch
- Plánovací komise programu pro Prioritu 1 OP JAK
- Mezirezortní komise k řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a v Karlovarském kraji
- Mezirezortní komise pro řešení revitalizace Moravskoslezského kraje

a další. Kromě účasti na jednáních v České republice se zástupci týmu RESTART účastnili také zahraničních akcí pro sdílení dobré praxe:

- 9. 5.–10. 5. – CINTRAN academy v Ida-Virumaa (Estonsko) - projekt zaměřený primárně na 4 vybrané uhlíkově intenzivní regiony v Evropě, reskilling a upskilling a jednání o problémech regionu Ida-Virumaa.
- 9. 10.–12. 10. – Evropský týden regionů a měst 2023, Harness the potential, RESTART the region – prezentování strategie RE:START a následná diskuse o strategiích pro regionální růst a transformaci.
- 24. 10.–25. 10. – Platforma spravedlivé transformace – sdílení informací a dobré praxe (Brusel, Belgie).
- 26. 10.–27. 10. – „International Forum for Coal Regions in Transition“ – prezentování Strategie RE:START pro účastníky z vybraných zemí mimo EU a Evropu (Berlín, Německo).



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V rámci činnosti MMR se dále výkonný tým účastnil vzdělávacích aktivit MMR typu: ICT dovednosti (MS Office), řídicí kontrola – objednávky, školení na novinky v českém jazyce, projektové řízení pro neprojektové manažery apod.

Pro zvýšení informovanosti o aktivitách se využívají facebookové profily:

- [RESTART Ústeckého a Karlovarského kraje](#);
- [RESTART Moravskoslezského kraje](#)

Na webových stránkách Strategie RE:START a MST (Uhelné regiony)

- www.restartregionu.cz;
- www.dotaceu.cz/uhelneregiony.

Celkem bylo zveřejněno na těchto platformách 171 příspěvků, které se týkaly agend oddělení RESTART. Na sociálních sítích bylo zveřejněno 134 příspěvků a 37 článků na webových stránkách MMR – RESTART a Dotace/Uhelné regiony.

Členové týmu RESTART se také aktivně podíleli na akcích pořádaných MMR, např. se jako hodnotitelé účastnili soutěže „Vesnice roku 2023“, účastnili se Národních stálých konferencí či jiných akcí, kde se podíleli na organizačním zajištění.

Jednou z nejvýznamnějších akcí, které se tým RESTART účastnil, byl Výroční politický dialog, který se konal v Karlových Varech, v nově zrekonstruované budově Císařských lázní. **Politický dialog („Annual Political Dialogue“)** se konal ve dnech 27. a 28. června 2023 na téma spravedlivé energetické transformace uhelných regionů.

Na zasedání byla prezentována sdělení na vysoké úrovni, která se týkala stavu přechodu na bezuhelnou energetiku v uhelných regionech. Byl také zdůrazněn trvalý závazek k postupnému ukončení těžby uhlí. V úvodní diskusi se představila eurokomisařka pro energetiku Kadri Simson, eurokomisařka pro soudržnost a reformy Elisa Ferreira, saský ministr pro regionální rozvoj Thomas Schmidt, slovenský ministr investic, regionálního rozvoje a informatizace Peter Balík, místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro regionální rozvoj Ivan Bartoš a hejtmán Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Po zahájení proběhly paralelně tři panelové diskuse, na kterých byla věnována pozornost aktuálním otázkám spojených s přechodem na nízkouhlíkovou ekonomiku a různorodostí uhelných regionů v Evropě. Byly projednávány výzvy, se kterými se uhelné regiony Evropské unie potýkají na cestě ke klimatické neutralitě, jak této neutrality dosáhnout a byly vyzdvíženy i příklady dobré praxe, např. z Estonska či Švédska.

Druhý den měli účastníci dialogu možnost navštívit lokality, které ilustrují hlavní výzvy a nové perspektivy tohoto území v transformaci. Tato událost napomohla k semknutí transformujících se uhelných regionů EU a k hlubší spolupráci.

Závěrem akce bylo přijato Karlovarské prohlášení¹, které udává směr, kterým by se měla ubírat debata o budoucnosti uhelných regionů.

V rámci českého předsednictví Visegrádské skupiny byl ve dnech 10.–11. října 2023 pořádán Ministerstvem pro místní rozvoj pro zástupce čtrnácti členských států EU, Evropské komise a Evropské

¹ “OPST. (2023). ‘Karlovarské prohlášení’. Dostupné na: <https://opst.cz/politicky-dialog-v-karlovyh-varech-propojil-uhelne-regiony-napric-evropou/> [Cit. 9. ledna 2024].”



investiční banky expertní workshop nazvaný **Od uhelných regionů k budoucnosti Spravedlivé transformace („From Coal Regions to the Just Transition Future“)**. Na setkání, které proběhlo v Ústeckém kraji účastníci diskutovali o nástrojích pro obnovu hospodářské, sociální a environmentální situace regionů, na kterých se podepsala těžba uhlí.

Diskuse byla věnována zkušenostem z přípravy plánů spravedlivé územní transformace v jednotlivých zemích, provádění navazujících programů, identifikaci strategických projektů, také možným kritickým místům a doposud získaným zkušenostem při využití Fondu pro spravedlivou transformaci a jeho směřování do budoucna.

Účastníci akce měli také možnost navštívit „Radovesickou výsypku“, která vznikla jako jedna z největších v Evropě na místě několika obcí zasypaných výsypem z povrchových hnědouhelných lomů v okolí města Bílina.

Pod záštitou Moravskoslezského kraje probíhala dvoudenní mezinárodní konference zaměřená na vodíkové technologie a rozvoj vodíku ve dnech 23.–24. října 2023 v Multifunkční aule Gong, Ostrava Dolní oblast Vítkovic. v Ostravě. Na významné události nechyběl ani výkonný tým Strategie RE:START.

Tato prestižní akce nesla název „**H2 Fórum 2023 - Na rozcestí transformace**“. Účelem mezinárodní konference H2 Fórum 2023 bylo představit klíčové stakeholdery, poskytnout prostor pro diskusi a networking, a popularizovat znalosti o bezemisních technologiích.

Tato konference byla zaměřena na vodíkové technologie a rozvoj vodíku v České republice. Cílem bylo představit budoucnost vodíkových technologií a jejich potenciál pro transformaci energetického sektoru.



2. Strategie RE:START

2.1 Aktualizace Strategického rámce hospodářské restrukturalizace ÚK, MSK a KVK

Aktualizace Strategického rámce (dále též „SR“) probíhá v pravidelných cyklech, každé 3 roky. Tím je zajištěno ověření změn ve strukturálně postižených regionech, aktuálnosti nastavení a rozsahu definovaných pilířů.

Příprava aktualizace Strategického rámce byla konzultována s externími odborníky na jednotlivé pilíře a sekretariáty Regionálních stálých konferencí (dále „RSK“). Na regionální úrovni byl v dubnu 2023 představen harmonogram přípravy a byly spuštěny aktivity vedoucí k realizaci aktualizace SR včetně aktualizace Vstupní analýzy

Samotné aktualizaci předcházela výběr zpracovatele. V květnu 2023 byl zpracován návrh na podání nabídky. V červnu 2023, po projednání návrhu na regionální úrovni, byla nabídka zveřejněna. Na základě posouzení nabídek byla vybrána společnost GaREP, s. r. o.

Od srpna do října 2023 se připravovala aktualizace Vstupní analýzy, ze které vychází Strategický rámec. Aktualizace probíhala za pomoci externích expertů týmu RESTART. První návrh aktualizace byl projednán s kraji na začátku října 2023. Po zapracování připomínek proběhla 23. 10. 2023 akceptace aktualizace Vstupní analýzy.

Od října 2023 probíhá příprava aktualizace Strategického rámce, opět byli osloveni externí odborníci, kteří definovali oblasti nutné k přepracování, aktualizaci a inovaci s důrazem na nové myšlenky a metody. Především se zaměřili na problematiku pilířů SR a jejich korespondování s potřebami krajů v současné době. První návrh aktualizace SR byl konzultován s kraji a tripartitami 7. 12. 2023, kdy k tomuto tématu proběhlo jednání na Ministerstvu pro místní rozvoj v Praze. Dne 20. 12. 2023, po zapracování všech připomínek, byla akceptována II. fáze přípravy aktualizace SR.

Aktualizace je výsledkem široké shody regionálních aktérů všech tří dotčených krajů a výstupem z mnoha jednání se zástupci příslušných resortů.


2.2 Implementační zásady

Implementační zásady Strategie RE:START byly aktualizovány společně s aktualizací Souhrnného akčního plánu hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2023–2024, jako příloha č. 2 – Implementační zásady a byly schváleny vládou ČR usnesením č. 1047 ze dne 14. prosince 2022. Tyto zásady řeší fázi přípravy, fázi naplňování Akčních plánů restrukturalizace a jejich respektování a jsou nezbytnou podmínkou úspěšné realizace a zajištění jednotného postupu a kontinuity v dlouhodobém procesu restrukturalizace.

Implementace Strategie RE:START je agendou oddělení RESTART, které je součástí Odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Vedení výkonného týmu je v gesci vedoucího oddělení RESTART.




Schéma Strategie RE:START

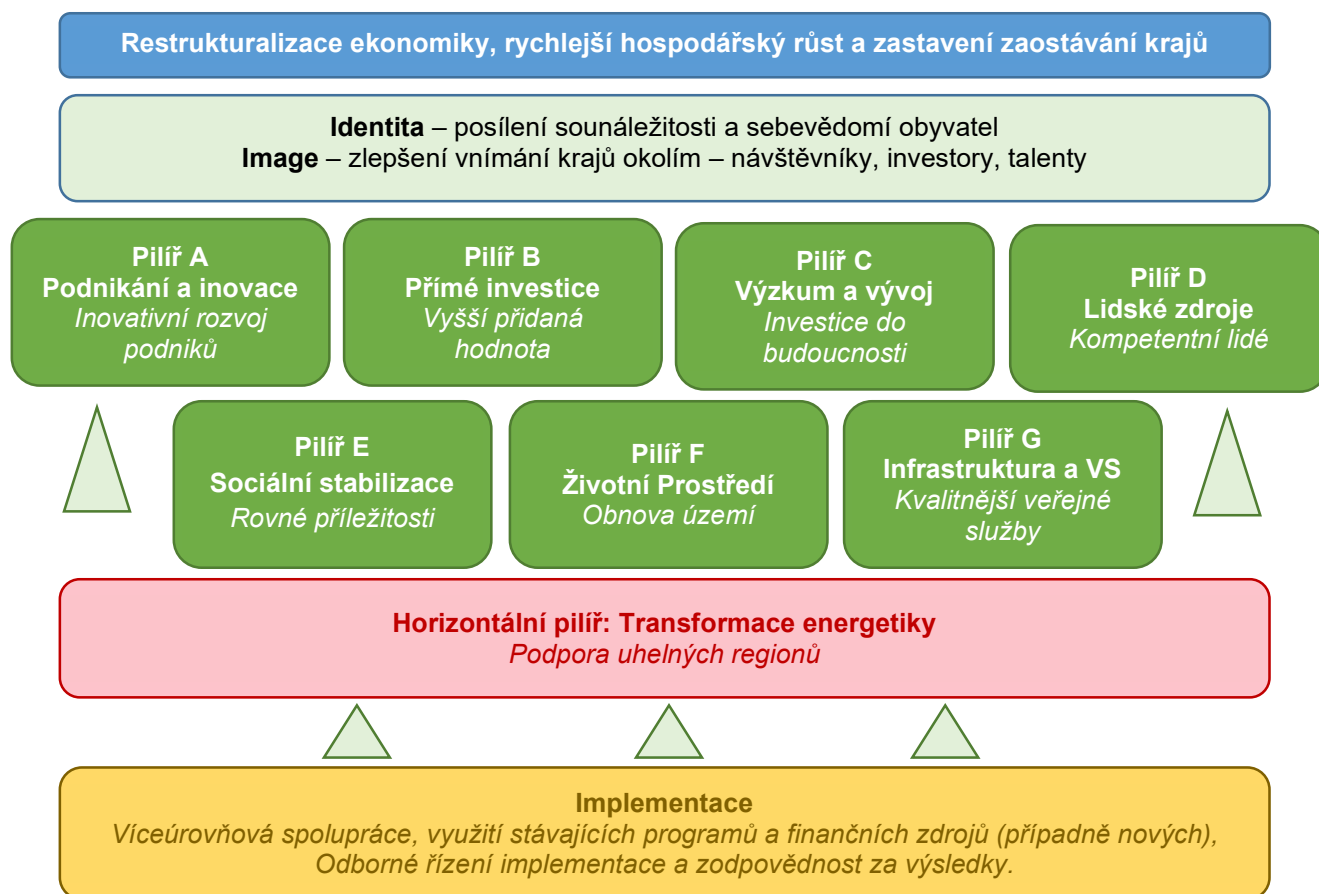

2.3 Aktuální stav naplňování akčních plánů

Stav realizace opatření v pěti Akčních plánech (AP1–AP5)

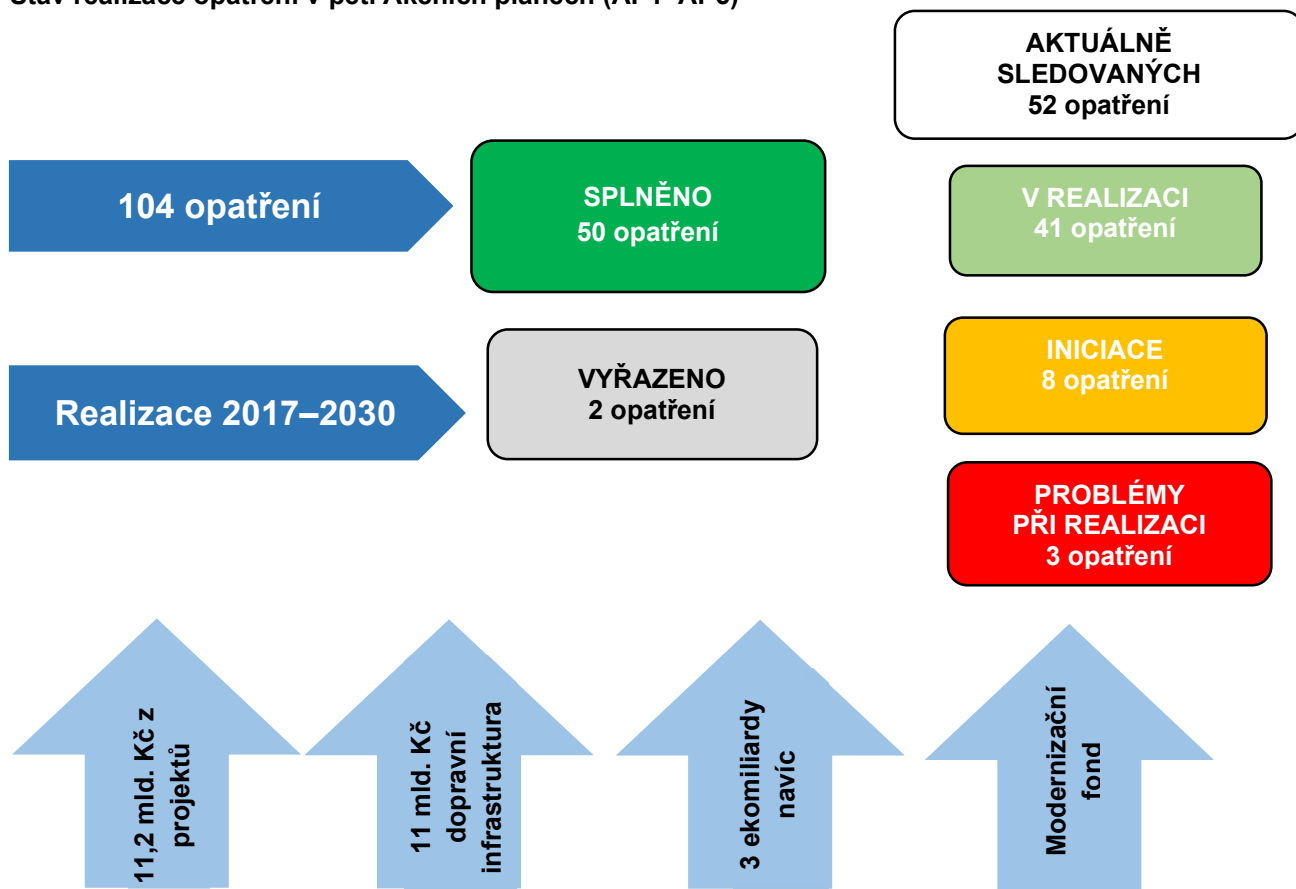

Blíže viz Příloha č. 1 Přehled naplňování opatření AP1–AP5.

Níže uvedená tabulka (tabulka č. 1) zahrnuje vyčíslení finančních prostředků, které byly již v rámci regionů rozděleny konkrétním žadatelům v dotačních výzvách ve vazbě na opatření Strategie RE:START. Údaje nezahrnují např. prostředky vynaložené na výstavbu dálnic a silnic I. třídy. Dále také tabulka neobsahuje alokace aktuálně vyhlášených výzev, jejichž proces hodnocení nebyl ještě ukončen.

TABULKA 1 - Přehled kumulativního čerpání dotačních prostředků v regionech od zahájení Strategie RE:START do 31. 12. 2023 v meziročním srovnání

Rok	NUTS II Moravskoslezsko	NUTS II Severozápad	Ústecký	Karlovarský
2019	3 675 810 031	2 615 336 909	2 205 993 876	409 343 033
2019–2020	4 674 631 117	4 405 329 778	2 952 673 086	1 452 656 692
2019–2021	4 824 089 112	4 720 962 105	3 211 419 462	1 509 542 643
2019–2022	5 307 693 637	5 223 049 131	3 508 949 944	1 714 099 187
2019–2023	5 641 348 995	5 572 888 761	3 730 442 021	1 842 446 740
CELKEM	11 214 237 756 Kč			

Zdroj: Vlastní zpracování



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Podrobnější přehled čerpání jednotlivých dotačních programů v jednotlivých regionech viz „Příloha č. 3 Souhrn čerpání RE:START“.

Do naplňování Strategie RE:START vstupují i další nástroje, které přímo ovlivňují úspěšnost její realizace a jsou obtížněji vykazatelné. Jedná se např. o **modernizace vybrané dopravní infrastruktury** v rámci Dopravní sektorové strategie Ministerstva dopravy ve výši **11 mld. Kč**, navýšení programu „Ekomiliardy“ o **další 3 mld. Kč**, které již nyní začínají sloužit² k podpoře projektů na regeneraci a resocializaci území zasaženého těžbou a které by bez tohoto navýšení již nemohly být realizovány. Jedná se o prostředky, které se budou v následujících letech v regionu Severozápad rozdělovat. Dále pak výzvy z **Modernizačního fondu, které se budou vyhodnocovat v následujících letech**, a kde je ve výzvách zvýhodnění pro strukturálně postižené regiony. Jednou z iniciativ Modernizačního fondu je výzva RES+ č. 1/2024, která se zaměřuje na podporu výstavby fotovoltaických elektráren do 5 MW na již existujícím odběrném místě k výrobě zelené energie pro vlastní spotřebu. Tato výzva je otevřena od 1. 3. 2024 do 31. 10. 2024 a celková alokace prostředků pro tuto výzvu je 3 miliardy korun. Přednostně budou podpořeny projekty instalací FVE realizované v jednom z následujících krajů: KVK, MSK a ÚK. Pro tyto projekty je vyhrazena alokace ve výši 0,5 mld. Kč. Pokud nedojde k vyčerpání přednostní alokace do 30. 9. 2024, bude její zbývající část uvolněna pro podporu všech projektů.

Bližší informace jsou dostupné na webu Státního fondu životního prostředí ([SFŽP ČR – Státní fond životního prostředí ČR \(sfzp.cz\)](https://sfzp.cz)).

2.4 Realizace opatření

Ke dni 31. 12. 2023 byla v regionech **podpořena řada projektů v rámci již vyhlášených výzev** z níže uvedených programů a opatření a došlo k čerpání na konkrétní projekty v jednotlivých regionech.

Ve sledovaném roce 2023 se výkonnému týmu RESTART podařilo participovat na přípravě nových programů. Byla řešena problematika hospodářsky a sociálně ohrožených území (dále jen „HSOÚ“). Byly vyhlášeny výzvy v rámci dotačních programů MMR: Podpora revitalizace území v podprogramech Demolice v sociálně vyloučených lokalitách a Podpora rozvoje regionů v podprogramech Podpora obnovy a rozvoje venkova a Podpora obcí s 3001–10000 obyvateli. Strukturálně postižené regiony jsou v dotačních titulech MMR zvýhodněny, a to zejména bodově (5–15 bodů) či speciální alokací určenou přímo pro strukturálně postižené regiony,

Přehled výzev v roce 2023 zaměřených na podporu opatření Strategie RE:START:

- **Revitalizace území – Podprogram Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách**, výzva č. 1/2023/117D081 vyhlášena 15. února 2023, příjem žádostí byl do 21. března 2023, dotační titul DT1 byl určen pouze pro území Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje, žádost úspěšně podalo 5 žadatelů. Podprogram byl zaměřen na podporu demolice budov v obcích s rizikem vzniku sociálně vyloučené lokality. Demolice objektu předpokládala celkovou revitalizaci prostoru, včetně možné výstavby objektu, který bude sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení. Cílem podprogramu je připravit území tak, aby jej bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce a zamezit tak vzniku oblastí se sociální segregací.

² Zatím se stále ještě dočerpává původní alokace 15 mld. Kč. Podpora je rozdělována na základě pravidelně aktualizované Koncepce řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v ÚK a KVK a v roce 2020 byla zpracována její 4. aktualizace.



- **Podpora rozvoje regionů 2019+ - Podprogram Podpora rozvoje a obnovy venkova**, výzva č. 2/2023/117D8210 byla vyhlášena 6. dubna 2023, příjem žádostí probíhal od 2. května do 5. června 2023. Konkrétně se jednalo o výzvu: 117D8210A **Podpora obnovy místních komunikací** a 117D8210E **Rekonstrukce a přestavba veřejných budov**. Cílem výzvy bylo podpořit obnovu a rozvoj obcí do 3 000 obyvatel (včetně), s důrazem na obce do 1 500 obyvatel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru, zejména v hospodářsky a sociálně ohrožených územích a ve strukturálně postižených krajích (Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém). Nastavení podprogramu předpokládá participaci místních obyvatel, sdružení a občanských spolků při obnově a rozvoji obcí. O tuto podporu byl velký zájem a ze strukturálně postižených regionů bylo celkem úspěšně podáno 121 žádostí.
- Podpořeny byly také větší obce z **Podprogramu Podpora obcí s 3 000 – 10 000 obyvateli**, výzva č. 1/2023/117D8220 byla vyhlášena 6. dubna 2023, příjem žádostí probíhal od 2. května do 5. června 2023, konkrétně 117D8220A **Podpora obnovy místních komunikací**, kde bylo podáno 19 úspěšných žádostí ze strukturálně postižených regionů. Cílem této výzvy bylo podpořit obnovu a rozvoj středně velkých obcí, s důrazem na obce do 9 tis. obyvatel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru, zejména v hospodářsky a sociálně ohrožených územích a ve strukturálně postižených krajích (Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém). Nastavení podprogramu předpokládalo zapojení místních obyvatel, sdružení a občanských spolků při obnově a rozvoji obcí.
- Technologická agentura ČR (dále jen „TA ČR“) vyhlásila dne 9. února do 5. dubna 2023 příjem žádostí do **2. veřejné soutěže** programu **SIGMA – dílčí cíl 2: Začínající výzkumníci/výzkumnice a vyrovnávání příležitostí v projektech aplikovaného výzkumu (DC2)**, jehož cílem je zvýšit zapojení začínajících výzkumníků/výzkumnic a vyrovnávat příležitosti pro ženy a muže v konkurenci aplikovaného výzkumu. Dílčí cíl 2 navazuje na aktivity programu ZÉTA. V této veřejné soutěži byla stanovena specifická alokace pro strukturálně postižené regiony (RE:START) v celkové výši 18,4 mil. Kč. Z této alokace je 9,2 mil. Kč určeno pro Ústecký a Karlovarský kraj (region NUTS II Severozápad) – a 9,2 mil. Kč pro Moravskoslezský kraj (region NUTS II Moravskoslezsko).
- TA ČR vyhlásila dne 5. dubna 2023 **10. veřejnou soutěž** programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje **TREND, podprogram 1 „Technologičtí lídři“** (dále jen „PP1“), příjem žádostí byl od 6. dubna do 24. května 2023. Veřejná soutěž programu TREND, PP1 byla zaměřena na podporu tvorby výsledků VaV a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost u podniků, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami nebo u podniků, které mají zkušenost s nákupem VaV služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní VaV činnost. Jedním z bonifikačních kritérií bylo řešení ve strukturálně postiženém regionu RE:START.
- **1. veřejnou soutěž** v programu **DOPRAVA 2030** vyhlásila TA ČR s příjmem žádostí od 27. dubna do 28. června 2023, v této veřejné soutěži byla stanovena specifická alokace pro strukturálně postižené regiony (RE:START) v předpokládané výši 19,2 mil. Kč pro Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj. Veřejná soutěž byla zaměřena na podporu návrhů projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Výstupy/výsledky musely mít potenciál pro další uplatnění do praxe. Veřejná soutěž svým zaměřením pokrývá výzkum celého



dopravního sektoru a všech druhů dopravy, tj. pozemní, vodní a letecké, včetně všech typů dopravních prostředků a dopravní infrastruktury.

- Dne 14. září 2023 vyhlásila Technologická agentura ČR **1. veřejnou soutěž** programu **THÉTA 2, s podprogramem 1 „Výzkum ve veřejném zájmu“** (dále jen „PP1“), **podprogramem 2 „Energetické technologie pro konkurenceschopnost“** (dále jen „PP2“) a **podprogramem 3 „Technologie k zajištění dlouhodobé udržitelnosti energetiky“** (dále jen „PP3“). Příjem žádostí probíhal od 14. září do 27. října 2023. Veřejná soutěž byla zaměřena na podporu návrhů projektů, které by měly přispět k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v podobě přípravy inovativních technologií, technických řešení a přístupů uplatnitelných v energetice v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu a dále tvorbou analýz pro rozhodování v energetice a zkvalitnění regulatorního rámce. V této veřejné soutěži byla stanovena specifická alokace pro strukturálně postižené regiony (RE:START) v celkové výši 72 mil. Kč. Z této alokace je 36 mil. Kč určeno pro Ústecký a Karlovarský kraj (region NUTS II Severozápad) – a 36 mil. Kč pro Moravskoslezský kraj (region NUTS II Moravskoslezsko).

Níže je uveden přehled podpor pro strukturálně postižené regiony s uvedením konkrétního zvýhodnění a přidělenou částkou do strukturálně postižených regionů.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Tabulka 2 – Přehled vyhodnocených výzev za uplynulé období (rok 2023)

Název výzvy / dotační titul	Vyhlášeno	Zvýhodnění	Přidělená částka do regionů (v Kč)
Revitalizace území – Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách – DT1 na území MSK, ÚK a KVK	MMR – 02/2023	Výzva DT1 určena pouze pro strukturálně postižené regiony	11 529 651
Podpora rozvoje regionů 2019+ – Podpora obnovy a rozvoje venkova – obce do 3 000 obyvatel – Podpora obnovy místních komunikací	MMR – 04/2023	HSOÚ a zároveň strukturálně postižený kraj zvýhodnění 15 bodů	188 351 939
Podpora rozvoje regionů 2019+ – Podpora obnovy a rozvoje venkova – obce do 3 000 obyvatel – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov	MMR – 04/2023	HSOÚ a zároveň strukturálně postižený kraj zvýhodnění 15 bodů	128 194 565
Podpora rozvoje regionů 2019+ – Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli – Podpora obnovy místních komunikací	MMR – 04/2023	HSOÚ a zároveň strukturálně postižený kraj zvýhodnění 15 bodů	71 614 212
Program TA ČR SIGMA DC 2. veřejná soutěž	TA ČR – 02/2023	Specifická alokace pro ÚK, MSK a KVK	27 649 237
Program TA ČR TREND PP1 10. veřejná soutěž	TA ČR – 04/2023	Bodové zvýhodnění 10 bodů – řešení ve strukturálně postižených regionech	241 392 304
Program TA ČR DOPRAVA 2030 1. veřejná soutěž	TA ČR – 04/2023	Specifická alokace pro ÚK, MSK a KVK	14 763 080
CELKEM			683 494 988

Zdroj: Vlastní zpracování


Spolufinancováno
Evropskou unií

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

2.5 Indikátory

Jedním ze způsobů, jak **je sledována účinnost jednotlivých opatření akčního plánu je využití tzv. indikátorů**. Část z nich je definována přímo v Akčních plánech, ale využity jsou i další, které vyplývají z jednotlivých projektů a dotačních programů a jsou tak lépe sledovatelné. Uváděné hodnoty vycházejí z projektů již realizovaných a evidovaných, řada dalších projektů je ještě v procesu realizace či u nich data zatím nejsou k dispozici. **Informace k indikátorům jsou zjišťovány výkonným týmem komunikací s příjemci podpory, řídicími orgány a jsou průběžně zaznamenávány do tzv. projektových karet k evidenci a dalšímu vyhodnocení**. V závislosti na termínu realizace a ukončení projektu a komunikaci s příjemci se průběžně aktualizují výsledky a hodnoty indikátorů. Indikátory jsou vykazovány souhrnně i zvlášť za jednotlivé regiony (ÚK, KVK i MSK) a vycházejí z projektů realizovaných z výzev vyhlašovaných od roku 2016.

Tabulka 3 - Přehled výchozích projektů v číslech

Počet realizovaných/evidovaných projektů	342
ÚK	147
MSK	151
KVK	44
Počet projektů ve fázi realizace	274
ÚK	120
MSK	101
KVK	53
Počet nerealizovaných projektů*	24
ÚK	5
MSK	16
KVK	3
Počet projektů bez zpětné vazby od žadatele**	14
ÚK	11
MSK	2
KVK	1

Zdroj: Vlastní zpracování

* přestože byla přidělena dotace, projekt nakonec nebyl žadatelem realizován a dotaci nečerpal; uváděným důvodem byla v několika případech situace s pandemií Covid19 či např. Zelená dohoda pro Evropu, kdy žadatel uvedl, že ho situace nutí k radikálnějšímu opatření v oblasti transformace, a tudíž k přípravě jiného projektu, než na který získal dotaci; v některých případech žadatel neuspěl v prvním kole, s dotací již nepočítal, a když mu nakonec byla přidělena, odmítl ji, jelikož mezitím již zpracoval a podal jiný projekt

** žadatel (zatím) neúspěšně osloven s žádostí o vyplnění základních informací do tzv. projektové karty; průběžný proces, který bude nadále pokračovat

Z rozhovorů se zástupci příjemců jednotlivých projektů se nad rámec sledovaných indikátorů objevují **sekundární přínosy v území**, kde díky strategii RE:START byly čerpány finanční prostředky např. na demolice v sociálně vyloučených lokalitách, rozvoj a obnovy venkova, brownfieldy, rozvojové studie, infrastrukturu ZŠ či další. Mezi nejčastěji zmiňovanými pozitivními efekty jsou:

- celkové či částečné zlepšení stavu lokality;
- definování rozvojových příležitostí;
- podpora místní podnikatelské sféry, podpora budoucích investic;



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- posílení infrastruktury;
- snížení sociopatologických jevů, kriminality, řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit;
- úspora finančních prostředků za opravy či dozor v území, omezení výjezdů Integrovaných záchranných složek do lokalit;
- příklady dobré praxe pro další projekty;

Blíže k indikátorům a jejich hodnotám viz samostatná Příloha č. 4 – Indikátory.

2.6 Bariéry a rizika další realizace

Za nejvýznamnější rizika procesu hospodářské restrukturalizace pro budoucí období lze považovat:


- **Personální podstav týmu RESTART**, protože bylo zajištěno financování pouze pro služební poměry, pracovní místa (celkem 5) byla zrušena. **Financování odráží potřeby implementace OPST a hrozí tak přerušení procesu hospodářské restrukturalizace**, zvláště když se již podařilo vzbudit zájem krajských aktérů a aktivovat je. Znovuzískání důvěry by bylo velice obtížné. Je potřeba zajistit další financování na rozšíření týmu.
- **Konsolidační vládní balíček**, a s tím související **nezajištění potřebných finančních zdrojů** nebo poskytování finančních zdrojů opatřením z akčních plánů, či jejich významné výkyvy v dostupnosti finančních zdrojů. Všechny případy by měly za následek ztrátu důvěry krajských subjektů a rozmělnění celého procesu restrukturalizace.

Následující odrážky zahrnují hlavní problémové oblasti, které se mohou negativně promítnout do dalšího pokračování Strategie RE:START.

- **Dopady válečného konfliktu na Ukrajině** – energetická krize, inflace, nezaměstnanost.
- **Nedostatečná podpora v oblasti zdravotnictví** – v kontextu obecně stárnoucí populace a snižování kvality života je stále větší potřeba se věnovat tomuto tématu.
- **Nutné zvýšení patriotismu a aktivního životního stylu** – opatření na podporu kultury – obnova kulturních památek. Nutné posílení kladné image krajů, potřeba zabránit odchodu mladých perspektivních obyvatel ze strukturálně postižených krajů.
- Ne vždy je možné **nastavit výzvy dotačních titulů** tak, aby umožnily realizaci konkrétních typů opatření.



3. Mechanismus spravedlivé transformace

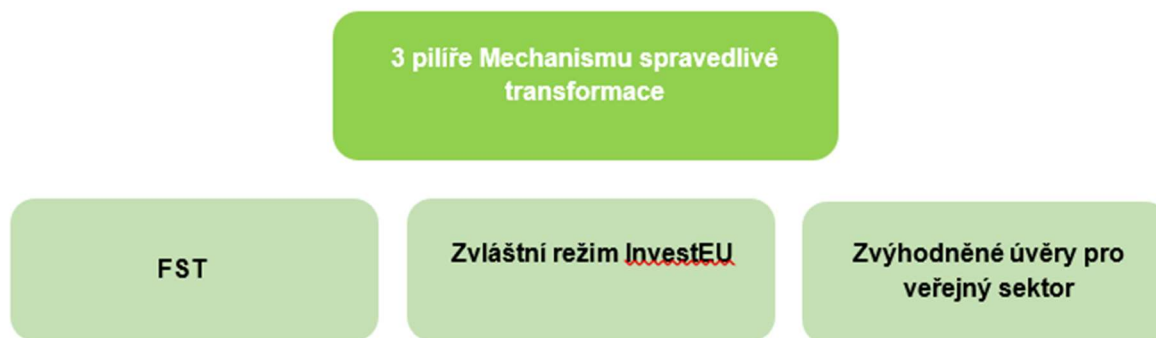

Jedná se o nástroj Evropské komise pro uhelné regiony. Mechanismus spravedlivé transformace (MST) je součástí jejího investičního plánu pro udržitelnou Evropu. Cílem nástroje je finančně a prakticky pomoci regionům, pro něž bude složité naplnit unijní cíl klimatické neutrality do roku 2050, tedy regionům závislým na fosilních zdrojích. Hlavním cílem mechanismu je zajistit transformaci a diverzifikaci hospodářství v dotčených regionech a pomoc při řešení dopadů spojených s přechodem k udržitelnější ekonomice. Velmi důležitá je pak součinnost veřejného a soukromého sektoru.

3.1 Plán spravedlivé územní transformace

Na základě usnesení vlády č. 815 ze dne 27. července 2020, oddělení RESTART zpracovalo tzv. Plán spravedlivé územní transformace (dále jen „PSÚT“), který byl **ze strany Evropské komise** spolu s **Operačním programem Spravedlivá transformace** schválen **26. 9. 2022**. PSÚT je základním dokumentem OPST. Oddělení RESTART proto v roce 2023 sledovalo jeho implementaci.

Výkonný tým v návaznosti na implementaci PSÚT a Mechanismu spravedlivé transformace zajišťuje primárně tyto činnosti:

- **Komunikaci se zástupci Evropské komise (EK)** – zejména DG REGIO a DG REFORM.
- **Účastní se jednání** se zástupci EK (jednotlivá DG), resortů a dotčených krajů, zaměřených na implementaci PSÚT, MST, potažmo OPST.
- **Spolupráci se zástupci Evropské investiční banky (EIB) a Národní rozvojové banky (NRB)** a přenos informací na evropskou primárně však národní a regionální úroveň. Účast na jednáních k finančním nástrojům a pomoc s koordinací těchto jednání. S EIB a NRB se řešilo **nastavení II. a III. pilíře MST** a příprava souvisejících finančních produktů, které jsou v jejich kompetenci. Aktualizovány byly webové stránky (viz níže), a to za účelem předání ucelené informace o těchto dvou pilířích a možnostech jejich využití širokému publiku. Výkonný tým RESTART se také účastnil osvětových akcí pořádaných v rámci probíhajících technických asistencí (TA) k těmto pilířům, které poskytuje společnost PwC, a je zastoupen i v Řídícím výboru technické asistence pro III. pilíř MST.
- Spolupráci na přípravě příručky pro žadatele (připravena v rámci TA k III. pilíři – PwC) a její zveřejnění na našich webových stránkách.
- **Díličí pomoc při řešení problémů regionů ve vazbě na procesy transformace.**
- **Provoz a průběžnou aktualizaci webových stránek s ucelenými informacemi o MST a souvisejících novinkách** – odkaz: [DotaceEU - Uhlé regiony](#). Webové stránky zahrnují informace jak obecného charakteru k MST a zpracování PSÚT, tak o **Transformační platformě či technické asistenci pro implementaci spravedlivé transformace (viz tzv. „TSI projekt“ níže)** a další informace. Webové stránky obsahují i finální podobu schváleného PSÚT, obsah



nařízení EK, aktuality, kontakty, prezentace ze seminářů/workshopů, zápisy z jednání Transformační platformy a další.

- **Sdílení souvisejících novinek na facebookových profilech RE:START.**
- **Koordinaci a dohled nad realizací TSI projektu** na implementaci spravedlivé transformace (podrobnosti níže).

3.2 TSI projekt na implementaci spravedlivé transformace:

- Projekt realizovaný v rámci nástroje „Technical Support Instrument“ je zaměřen na zlepšení implementace zdrojů z OPST, obecně pak šířeji chápané spravedlivé transformace. Hlavním cílem je **posílení iniciace projektů v regionech a podpora jejich dalšího rozvoje, tedy zvýšení absorpční kapacity v uhelných regionech. Dílčí části se věnují zlepšení participativního přístupu v procesu transformace, přenosu dobré praxe a přenosu znalostí z oblasti projektového plánování prostřednictvím odborných školení.** Sdílena je jak zahraniční dobrá praxe, tak i dobrá praxe mezi regiony navzájem.
- MMR (spolu s DG REFORM a MŽP) koordinuje zajištění poradenství, jedním z důvodů je pomoc žadatelům s menší administrativní kapacitou, ale i krajům v orientaci ve velkém množství dotačních příležitostí, které se v tomto období otevírají. Mnohé tituly mají i dílčí zvýhodnění pro uhelné regiony. Je proto klíčové zajistit jejich efektivní využití.
- Dosud se uskutečnilo 21 workshopů, školení, webinářů a podobných akcí. Vznikla „**Zpráva o dosavadních zkušenostech a doporučeních k implementaci FST**“ a připravují se šablony typových příkladů pro zastřešující projekty, jakožto i příručka dobré praxe a další analytické zprávy.
- Relevantní výstupy TSI projektu jsou a průběžně budou zveřejněny na již dříve zmíněných webových stránkách [DotaceEU – Uhlé regiony](#)
- **Realizace TSI projektu probíhá reálně od ledna 2023 a potrvá do poloviny roku 2024.**

3.3 Hodnocení Plánu spravedlivé územní transformace

Jak vyplývá ze samotného dokumentu PSÚT, jeho hodnocení je úzce provázáno s implementací Operačního programu Spravedlivá transformace. Vyplývajícími subjekty pro hodnocení cílů v pravidelných intervalech je Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí a jednotlivé kraje.

Ministerstvo pro místní rozvoj, oddělení RESTART mělo v gesci přípravu PSÚT a nyní je v roli strategického partnera pro naplňování cílů Spravedlivé transformace. Operační program Spravedlivá transformace byl schválen 26. září 2022, jedná se tedy o první hodnocení a v budoucnu bude toto hodnocení upravováno dle dostupných dat. Průběžné hodnocení tohoto dokumentu bude zařazeno do Zprávy o realizaci i v následujících letech. Hodnocení je zaměřeno na naplňování specifických cílů v přílohách PSÚT – Prioritní oblasti podpory v rámci regionálních plánů transformace, které mají kraje samostatně.

Stručný popis hodnocení

Hodnocení je založeno na datech získaných z MS21+. Jeho předmětem jsou výzvy, ve kterých byly ke dni 31.12.2023 evidovány přijaté žádosti. Hodnocení zahrnuje také žádosti, které byly zaznamenány, ale byly staženy ze strany podávajícího, s očekáváním jejich brzkého opětovného podání. Následně jsou tyto výzvy zařazeny ke krajským specifickým cílům PSÚT dle příloh „Prioritní oblasti podpory v rámci regionálních plánů transformace“ u jednotlivých krajů. Vzhledem k tomu, že prozatím není žádný projekt ve stavu „fyzicky ukončený“ není v roce 2023 hodnoceno naplnění indikativní alokace. Strategické projekty krajů byly přiřazeny dle materiálů příslušných krajů ke specifickým cílům a přispívají tím ke splnění cílů.



Dalším stupněm hodnocení naplňování cílů PSÚT je vyhodnocení indikátorů, které jsou součástí dokumentu nařízení o FST. Indikátory a jejich hodnocení má v gesci MŽP, které je 2x ročně vykazuje Evropské komisi, a to pouze data za projekty, které jsou ve fázi „projekt fyzicky ukončen“ a vyšší. Hodnocení krajských transformačních plánů je v gesci příslušných krajů.

V rámci PSÚT bylo počítáno se třemi typy plánovaných operací tzv. tematické výzvy, skupiny projektů (zastřešující projekty) a projekty strategického významu. Tato typologie splňuje zadání v PSÚT.

Ústecký kraj

Ústecký kraj si stanovil v PSÚT 14 specifických cílů, z toho 12 bylo v roce 2023 alespoň částečně naplňováno prostřednictvím registrovaných žádostí v tematických výzvách, zastřešujících projektech a strategických projektech. Z toho 6 cílů je prozatím naplňováno jen přes Strategické projekty. ÚK v příloze PSÚT č. 2.4.2.b definoval pro tyto specifické cíle indikativní alokace. Vzhledem k počtu specifických cílů často disponuje omezenou indikativní alokací, což může způsobit, že dopady finančních intervencí v regionu nemusí být patrné.

V Ústeckém kraji bylo původně počítáno s 11 Strategickými projekty (dále jen „SP“), podáno bylo 9, dva SP POZATR a Gigafactory odstoupily.

Plnění prioritních os dle přílohy 2.4.2.b. v Ústeckém kraji za rok 2023

1. Podnikání, výzkum, inovace zahrnuje následující specifické cíle:

- a) Zvýšení inovační výkonnosti regionu, posílení výzkumné a inovační kapacity s důrazem na oblasti specializace kraje:**
 - K naplňování by měly pomoci SP Transformační centrum Ústeckého kraje a GET Centre UJEP – Green Energy Technologies Centre of UJEP.
- b) Zvýšení konkurenceschopnosti MSP:**
 - Je naplňována výzvou na zastřešující projekt Vouchery pro podnikatele a Řemeslné inkubátory (V rámci OPST je daná výzva klasifikována do sekce „Lidé a dovednosti“. Ale dle popisu je tato výzva zařazena právě do této sekce a konkrétního cíle PSÚT).
 - Finanční nástroj Úvěr transformace rovněž napomáhá k naplňování tohoto cíle pro MSP. Za rok 2023 došlo k poskytnutí 12 smluv v celkové výši 35,1 mil. Kč.
- c) Stabilizace a rozvoj klíčových odvětví pro transformaci regionu:**
 - K naplňování by měl pomoci SP H2 Triangle.
 - Dle přílohy č. 2 PSÚT bylo počítáno i s podporou velkých podniků, které však nelze z procesních a legislativních důvodů podpořit.
- d) Rozvoj kulturních a kreativních odvětví s jejich zapojení do celkového rozvoje kraje:**
 - Naplňován skrze výzvu Filmové vouchery (v OPST je tato výzva zařazena do sekce Lidé a dovednosti).

2. Kompetentní lidé a SMART region zahrnuje tyto specifické cíle

- a) Zlepšení přístupu ke kvalitním službám a infrastrukturám formálního a dalšího vzdělávání v oblastech specializace kraje:**
 - Naplňován skrze výzvy na Konektivitu škol a Odborné učebny.
- b) Zvýšení zaměstnanosti a uplatnitelnosti pracovníků na trhu práce:**
 - K naplňování by měl pomoci SP RUR – Region univerzitě, univerzita regionu. Místo SP POZATR, který odstoupil, se připravují specifické výzvy jako náhrada plnění sociálních témat, bude plněno v oblasti sociálních intervencí, odborných učeben SŠ a projektem Úřadu práce.
- c) Vyšší využití digitalizace pro efektivní a srozumitelné veřejné služby občanům:**
 - Naplňován skrze výzvu Digitalizace prostředí pro poskytování pečovatelských služeb.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

d) Zvýšení sociální soudržnosti a komunitní rozvoj v obcích:

- K naplňování by měl pomoci SP Animace pro spravedlivou transformaci Ústeckého kraje.

3. Nová energetika a efektivně využívané zdroje:

a) Rozvoj znalostí, technologií, systémů a infrastruktur pro čistou energii a rozvoj komunitní energetiky:

- K naplňování by měl pomoci SP Těžba lithia na Cínovci.

b) Rozvoj nových energetických odvětví:

- K naplňování by měly pomoci SP Zavádění vodíkové mobility ve městě Ústí nad Labem a SYNERGYS – systémy pro energetickou synergii.

c) Rozvoj komunitní energetiky:

- Tento cíl nebyl v roce 2023 naplňován.

d) Efektivnější využívání zdrojů, přechod k oběhovému hospodářství:

- V roce 2023 nebyl specifický cíl naplňován.
- Od 6. 12. 2023 do 30. 10. 2024 je vyhlášena výzva Inovativní projekty oběhového hospodářství v Ústeckém kraji, je tedy možné, že v dalším roce dojde k jeho naplnění.

4. Revitalizovaná území 21. století: Zahrnuje dva příbuzné specifické cíle **Zlepšení využitelnosti území dotčeného těžbou uhlí pro nové aktivity a Vyšší využití a transformace potenciálu průmyslového dědictví regionu:**

- Tyto specifické cíle jsou naplňovány výzvami na Obnovu území – Koncepce a příprava projektů; Veřejné služby, kultura, sport, rekreace a Infrastruktura – Ústecký kraj, avšak jejich skutečné dopady projektů na specifické cíle lze posuzovat v následujících letech.
- K naplňování by měl napomoci SP Green Mine – revitalizace a resocializace lomu ČSA.

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj má v PSÚT stanoveno 8 specifických cílů, což představuje nejmenší počet priorit v krajském srovnání. 7 z nich je na území MSK alespoň částečně naplňováno skrze tematické výzvy, zastřešující projekty a strategické projekty. Z toho 3 cíle jsou prozatím naplňovány jen přes Strategické projekty. Jedná se o vyšší koncentraci na tematické oblasti a očekává se viditelnější efekt v území. Ke specifickým cílům byly zařazeny i strategické projekty bez finanční alokace. Moravskoslezský kraj podal do výzvy na Strategické projekty 13 SP.

Plnění prioritních os dle přílohy 2.4.4.b. v Moravskoslezském kraji za rok 2023

1. Nová energie:

- K naplnění by měl napomoci SP Centrum veřejných energetiků.

2. Nové využití území:

- Jedná se o specifický cíl s nejvyšší indikativní alokací.
- Je naplňován ve 4 výzvách: Obnova území – Veřejné služby, kultura, sport, rekreace; Strategické brownfieldy (příprava a technická infrastruktura); Infrastruktura; Koncepce a příprava projektů.
- K naplňování může pomoci SP POHO Park, MUSEum+, PODOLUPARK Karviná a EDEN Karviná – výzkumný a vzdělávací park.



3. Zelený průmysl:

- Tento cíl není naplňován, protože byl zacílen na produktivní investice do velkých podniků, které však z procesních a legislativních důvodů nemohou být podpořeny.

4. Nové podnikání:

- Je naplňován přes zastřešující projekt Služby a programy pro podporu podnikání – Vouchery pro podnikatele.

5. Kompetentní lidé:

- Je naplňována výzvami Vzdělávání ve firmách a Odborné učebny.
- K naplňování může pomoci SP TRAUTOM – KOMPETENCE PRO 21. STOLETÍ, CEPIS, Educational District a Technologická a podnikatelská akademie a digitální, inovační a mediální laboratoř.

6. Inovační ekosystém:

- K naplňování by měl pomoci SP LERCO a REFRESH.
- V dalším roce může naplňování pomoci zastřešující projekt Vouchery pro univerzity, který byl vyhlášen 24. 11. 2023, ale v roce 2023 nebyly evidovány žádosti (v OPST je tato výzva zařazena v oblasti „Lidé a dovednosti“).

7. Digitální a kreativní region:

- Naplňováno výzvou Konektivita škol.
- K naplňování by měl pomoci SP Černá kostka.
- V příloze 2 má MSK zařazenou i podporu kulturních a kreativních odvětví (jako zastřešující projekt), kde lze zařadit i Filmové vouchery (vyhlášeno 6.12.2023 v typologii OPST je v kategorii „Lidé a dovednosti“). Po zaregistrování žádostí bude tato výzva taktéž zařazena do naplňování tohoto cíle.

8. Cirkulární ekonomika:

- K naplňování by měl pomoci SP CirkArena – Circular Economy R&D Centre
- Od 8. 12. 2023 do 30. 10. 2024 je vyhlášena výzva Inovativní projekty oběhového hospodářství v Moravskoslezském kraji, je tedy možné, že v dalším roce dojde k jeho naplnění.

Karlovarský kraj

Karlovarský kraj si stanovil 16 specifických cílů v příloze č. 2.4.3.b., což je nejvíce ze všech tří regionů. Na území KVK se podařilo v prvním roce fungování OPST alespoň částečně naplnovat 8 specifických cílů. Z toho 2 cíle jsou prozatím naplňovány jen přes Strategické projekty. Ke specifickým cílům byly zařazeny strategické projekty bez finanční alokace. Indikativní alokace je v této příloze uvedena pro celou prioritní osu, nikoli pro každý specifický cíl.

V Karlovarském kraji bylo původně počítáno s 11 Strategickými projekty (SP), podáno bylo 9 – Krajský business park Sokolov nebyl podán a Agentura pro transformaci Karlovarského kraje byla spojena s projektem Krajská kulturní a kreativní kancelář 4K.

Plnění prioritních os dle přílohy 2.4.3.b. v Karlovarském kraji za rok 2023

1. Tradice zahrnuje tematicky příbuzné specifické cíle **Začínající podnikání a Transformace firem:**

- Jsou naplňovány zastřešujícím projektem Vouchery pro podnikatele.
- K naplňování by měl pomoci SP Krajská kulturní a kreativní kancelář 4K (zařazena do této oblasti u OPST) a VI:aštvka.
- Od 15. 11. 2023 do 31. 12. 2024 je vyhlášena výzva na Řemeslné inkubátory (zařazeny v OPST do lidí a dovedností), je tedy možné, že v dalším roce dojde k naplňování i touto výzvou.
- V naplňování může pomoci Úvěr Transformace, kde v roce 2023 došlo k uzavření 5 smluv v celkové výši 47,9 mil. Kč.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

2. Inovace:

a) Výzkum, vývoj a inovace:

- K naplňování by měl pomoci SP Centrum lázeňského výzkumu a Karlovarské inovační centrum.

b) Kreativita design:

- K naplnění by měl pomoci SP Krajská kulturní a kreativní kancelář 4K – tento strategický projekt se prolíná oblastí podnikání i kreativity a designu.

c) Digitalizace a nové produkty:

- Specifický cíl byl naplňován výzvou na Konektivitu škol.

3. Znalosti:

a) Kvalitní vzdělávání:

- Je naplňován výzvou na Odborné učebny.
- K naplnění by měl pomoci SP Rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary.
- Od 16. 10. 2023 do 24. 4. 2024 je vyhlášen zastřešující projekt Náborové příspěvky pro učitele, je tedy možné, že v dalším roce dojde k naplňování i z tohoto projektu.

b) Rekvalifikace – nový začátek:

- V roce 2023 není naplňován.
- Od 29. 9. 2023 do 31. 12. 2024 je vyhlášena výzva Vzdělávání ve firmách, je tedy možné, že v dalším roce dojde k naplňování.

4. Spolupráce:

a) Kulturní a přírodní dědictví:

- Naplňován skrze výzvu Obnova území – Veřejné služby, kultura, sport, rekreace. Tato výzva je v OPST zařazena pod oblast Obnova území, avšak popisem by mohla z části naplňovat tento specifický cíl.

b) Nikdo není vyloučen:

- V roce 2023 nebyl naplňován.

5. Regenerace zahrnuje tematicky příbuzné specifické cíle:

a) Regenerace brownfieldů a starých ekologických zátěží a Regenerace krajiny a nové zemědělství:

- Jsou naplňovány 3 výzvami z oblasti Obnova území – Veřejné služby, kultura, sport, rekreace; Infrastruktura a Koncepce a příprava projektů.
- K naplnění by měl pomoci SP Udržitelná revitalizace a resocializace lokality Medard; Sokolovská investiční green development; Regenerace horského hotelu Klínovec a jeho okolí; či projekt Chytrá krajina+.

b) Zelená města a obce:

- V roce 2023 nebyl naplňován.
- Tento specifický cíl může být podpořen z jiných finančních zdrojů jako je Modernizační fond a OP ŽP.

6. Energie a materiály:

a) Dva velmi blízké cíle – Nová energie a Úspory energie:

- V roce 2023 nebyly tyto specifické cíle naplňovány.
- Nepřímou podporou u specifického cíle Úspory energie, která by mohla v dalších letech částečně tento cíl naplňovat, je výzva Podpora projektů pro veřejný sektor (konkrétně pak ty projekty, které jsou způsobilé k podpoře ve specifických cílech 1.1 a 1.2 OP ŽP a programu RES+) a podmínka DNSH, která je uplatňována napříč celým OPST.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- Tyto cíle mohou být podpořeny z jiných finančních zdrojů jako je Modernizační fond a OP ŽP.
- b) Toky hmoty a recyklace:**
 - Tento strategický cíl nebyl v roce 2023 naplňován.
 - Specifický cíl může být podpořen z jiných finančních zdrojů jako je Modernizační fond a OP ŽP.
- c) Přejchod k oběhovému hospodářství/cirkulární ekonomice:**
 - V roce 2023 nebyl tento specifický cíl naplňován.

V prvním roce implementace OPST se dařilo alespoň částečně naplňovat většinu specifických cílů prioritních os dle Příloh v PSÚT, které byly stanoveny u jednotlivých krajů. V následujícím období je potřeba se zaměřit na oblasti, které v roce 2023 vykazovaly nejnižší míru naplňování, jako je například oběhové hospodářství, čistá energie nebo snižování sociálních problémů.



4. Závěr

Oddělení RESTART v roce 2023 v návaznosti na výše uvedená vládní usnesení realizovalo aktivity související s realizací a implementací Strategie RE:START a podporou aktivit Mechanismu spravedlivé transformace, jak v regionech, tak napříč mezi nimi. Zajišťovalo kontinuitu realizace činností mezi veřejnou správou a kraji a též komunikaci směrem k Evropské unii, zejména k Platformě pro uhelné regiony v transformaci a z jejího rámce vyplývajících úkolů. Veškeré činnosti a působnost v aktivitách oddělení jsou v souladu se zaměřením strategie a jejich dopad se promítne do naplnění opatření a priorit RE:START i v budoucnu.

V roce 2023 se výkonný tým oddělení RESTART podílel zejména na:

- **Podpora aktivit ve vazbě na Mechanismus spravedlivé transformace** – zajištění podpory koordinace aktivit strategie RE:START s procesem implementace OPST a také ve vazbě na II. a III. pilíř MST a s tím související koordinace aktivit.
- **Příprava aktualizace Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje** – aktualizace Vstupní analýzy, aktualizace SR včetně konzultací k aktualizaci na regionální i národní úrovni a s externími odborníky.
- **Realizace opatření z pěti Akčních plánů Strategie hospodářské restrukturalizace ÚK, MSK a KVK.**
- **Aktivity spojené s technickou asistencí pro implementaci OPST.**
- **Hodnocení Plánu spravedlivé územní transformace.**

Pravidelně probíhá informovanost široké veřejnosti prostřednictvím webových stránek [Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Úvod \(mmr.cz\)](#) a [Dotace EU – Uhlé regiony](#).

Uhlé regiony čelí specifickým potřebám a výzvám, **transformace vyžaduje masivní investice do výzkumu a inovací, vzdělání, rozvoje nových technologií a rozvoje nových odvětví**. S ohledem na náročnost procesu transformace z hlediska finančního i časového je žádoucí zajištění kontinuity podpory. Cílená podpora dle potřeb regionů přináší rychlejší a větší dopad v procesu transformace. Zajištění této podpory přispěje k udržitelnější a diverzifikovanější ekonomice v uhelných regionech



5. Výhled na období 2024

Následující období bude věnováno naplňování vládních úkolů dle nastavených postupů, prohlubování spolupráce v rámci regionů a příslušných resortů, identifikaci rizik a návrhů na jejich eliminaci a dalšího nastavování pomoci strukturálně postiženým regionům.

Pro rok 2024 je prioritou dokončení aktualizace **Strategického rámce a příprava 6. Akčního plánu Strategie RE:START**. V daném roce dojde také k ukončení TSI projektu technické asistence na podporu implementace spravedlivé transformace. Více o projektu viz kapitola č. 3. V návaznosti na končící TSI projekt výkonný tým RE:START zvažuje podání žádosti na nový projekt.

Hlavní činností týmu RESTART lze spatřovat v pokračování zapojení do implementace **Mechanismu Spravedlivé transformace**, úzká spolupráce s řídicím orgánem OPST a spolupráce v území. Potřeba změny image území, posílení identity spolu s obnovou území a zlepšení socioekonomických podmínek, zaměření se na kvalitu vzdělávání a posílení lidského kapitálu, podpora podnikání, zlepšení životního prostředí, to vše jsou aktivity, ke kterým by měl přispět nejen MST, ale i cílená opatření Strategie RE:START.

Tým RESTART bude i nadále usilovat o **zvýhodnění či speciální alokace pro strukturálně postižené regiony** v připravovaných dotačních titulech, je připraven diskutovat s řídicími orgány a Národním orgánem pro koordinaci s cílem, aby byly potřeby těchto regionů v rámci územní dimenze promítnuty do nových operačních programů v dalším programovém období.

Na podzim roku 2024 se připravuje v souladu s implementačními zásadami **Konference Strategie restrukturalizace**. Cílem této konference je informovat o implementaci Strategie RE:START, představit finální aktualizaci Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje a společně projednat 6. aktualizaci Souhrnného Akčního plánu Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2025–2026.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Seznam použitých zkratk

Zkratka	Význam
AP	Akční plán
ČR	Česká republika
DG REFORM	Directorate General for Structural Reform
DG REGIO	Directorate General for Regional and Urban Policy
DNSH	Do No Significant Harm
DT	Dotační titul
EIB	Evropská investiční banka
EK	Evropská komise
EU	Evropská unie
FST	Fond spravedlivé transformace
FTE	Full time equivalent
HSOÚ	Hospodářsky a sociálně ohrožená území
ITI	Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace
KVK	Karlovarský kraj
MD	Ministerstvo dopravy
MMR	Ministerstvo pro místní rozvoj
MSK	Moravskoslezský kraj
MST	Mechanismus spravedlivé transformace
MŽP	Ministerstvo životního prostředí
NNO	Nestátní nezisková organizace
NOK	Národní orgán pro koordinaci
NRB	Národní rozvojová banka
OP	Operační program
OP JAK	Operační program Jan Amos Komenský
OPST	Operační program Spravedlivá transformace
OPTP	Operační program Technická pomoc
PSÚT	Plán spravedlivé územní transformace
RE:START	Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského Kraje
RSK	Regionální stálá konference
TP	Transformační platforma
TA ČR	Technologická agentura ČR
ŘO	Řídicí orgán
SFŽP	Státní fond životního prostředí
SP	Strategický projekt
SR	Strategický rámec
TSI	Technical Support Instrument
ÚK	Ústecký kraj
VŠE	Vysoká škola ekonomická
VaV	Výzkum a vývoj



Seznam tabulek a grafů

Tabulka 1 – Přehled kumulativního čerpání dotačních prostředků v regionech od zahájení Strategie RE:START do 31. 12. 2023 v meziročním srovnání 9

Přílohy

Příloha 1 – Přehled naplňování opatření AP1–AP5
Příloha 2 – Přehled realizovaných opatření AP1–AP5
Příloha 3 – Souhrn čerpání RE:START
Příloha 4 – Indikátory



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 1 - Přehled naplňování opatření AP1 - AP5

Barevné rozlišení v celém dokumentu:

	Finalizace/Splněno
	Částečně splněno
	Problémy při realizaci
	Nutná iniciace realizace
	Rozpracováno
	Vyřazeno ze sledování
	<i>Aktuální opatření ve sledování*</i>
	Aktualizováno v jiném Akčním plánu

** opatření, která se sledují => částečně splněno, problémy při realizaci, nutná iniciace a rozpracováno*

Karta Seznam všech opatření

obsahuje všechna opatření z AP1-AP5

jednotlivá opatření jsou barevně rozlišena dle aktuální fáze naplňování

Karta Splněná opatření

obsahuje všechna splněná opatření spolu s komentářem

Karty AP1 - AP5

každá karta obsahuje opatření z jednoho AP

tato opatření už jsou evidována se všemi komentáři, povinnostmi, gescí,

Důležité

jakmile se mění jakákoli informace v jedné kartě, je nutné ji propsat/ probarvit do příslušných ostatních karet, aby nedocházelo k chybovosti



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

AP	Pilíř	Číslo opatření	Název opatření	Aktualizováno v:
1	A	I.A.1.1	Program na podporu modernizace technologií firem - Technologie	AP2
1	A	I.A.2.1	Podnikavý region (PODREG) - program na podporu začínajících podnikatelů či potenciálních podnikatelských záměrů	AP5
1	A	I.A.3.1	Podprogram programu TREND pro strukturálně postižené kraje	
1	B	I.B.1.3	Návrh komplexního projektu propojujícího v Ústeckém a Karlovarském kraji těžbu lithia a doprovodných kovů na ložisku Cínovec	
1	B	I.B.2.1	Program na regeneraci a podnikatelské využití brownfieldů vč. navýšení alokace tohoto programu	
1	C	I.C.1.1	Program zaměřený na podporu bilaterální spolupráce v aplikovaném výzkumu, včetně podpory přeshraničních projektů (Program DELTA2 – přímá návaznost na program DELTA)	
1	C	I.C.1.2	Program zaměřený na podporu technologického transferu, který by mohl do budoucna podporovat propojování lokálních inovativních MSP s výzkumnými organizacemi (Program GAMA2 – přímá návaznost na program GAMA)	
1	C	I.C.1.3	Podpora bilaterální a multilaterální spolupráce v aplikovaném výzkumu (program EPSILON)	
1	C	I.C.1.9	Vytvoření Národní inovační platformy pro chemii (NIP VIII. Chemie)	
1	C	I.C.2.1	Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (program ÉTA)	
1	C	I.C.2.3	Program získávání expertů pro krajskou VaV excelenci	
1	C	I.C.2.4	Zpracovat podrobnou analýzu potenciálů a reálných možností využití geotermální energie ve všech dotčených krajích	
1	C	I.C.2.5	Testování autonomních silničních vozidel v reálném (nebo téměř reálném) silničním provozu města Ústí nad Labem - U "SMART" ZONE	
1	D	I.D.1.1	Komplexní opatření „Regionální talent management“ - zvýšení atraktivity krajů pro život obyvatel a rozšíření nabídky perspektivních pracovních a kariérních vyhlídek pro mladé a kvalifikované odborníky	
1	D	I.D.1.3	Cílené komplementární výzvy z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro VŠ ve strukturálně postižených regionech	
1	D	I.D.1.4	Revize systému investičních pobídek - v případě všech okresů dotčených krajů bez ohledu na podíl nezaměstnaných osob poskytovat hmotnou podporu na vytváření pracovních míst v rozsahu 200 000 Kč/místo	
1	D	I.D.2.1	Komplex opatření rozvíjející kariérové poradenství a celoživotní vzdělávání v krajích	
1	D	I.D.2.2	Program „Yes, I do“ - zlepšení komunikace v anglickém jazyce u absolventů základních a středních škol	
1	D	I.D.2.3	Program zaměřený na přípravu zaměstnanců pro moderní průmyslové firmy (vzdělávání 4.0 a práce 4.0 pro průmysl 4.0)	
1	D	I.D.2.4	Rozvoj predikčního systému trhu práce prostřednictvím projektu KOMPAS	
1	D	I.D.2.5	Realizace projektů PIPS (Podpora informačních a poradenských středisek) a EFES (efektivní služby zaměstnanosti)	
1	D	I.D.2.6	Intenzivní využívání NSP v činnosti ÚP ČR (zprostředkování, poradenství, rekvalifikace)	
1	D	I.D.2.7	V souladu se zákonnými postupy při zadávání veřejných zakázek bude ÚP ČR při výběru dodavatelů poradenských služeb akceptovat nabídky a aktivně oslovovat řemeslné inkubátory	
1	D	I.D.2.8	Intenzifikace využití zvolené rekvalifikace – cílené využívání ustanovení § 109a Zákona o zaměstnanosti	
1	D	I.D.2.9	Zpracování analýzy možnosti zavedení podpory v rekvalifikaci i v případě § 109a Zákona o zaměstnanosti	
1	D	I.D.2.10	Realizace stávajících preventivních opatření v MSK a vyhodnocení jejich účinnosti na cílovou skupinu	
1	D	I.D.2.11	Zpracování analýzy možnosti vytvoření nových či přizpůsobení stávajících nástrojů podporujících přizpůsobení podniků a jejich zaměstnanců technologickým změnám v prostředí 4. průmyslové revoluce při zachování maximální možné míry zaměstnanosti	
1	D	I.D.2.12	Analýza současného stavu v oblasti sladování rodinného a pracovního života ve vybraných regionech, které jsou typické vyšším podílem zaměstnání v průmyslových odvětvích a s tím spojeným směnným provozem	
1	D	I.D.3.1	Program „Krok za krokem na trh práce“ – rozvoj zaměstnatelnosti dlouhodobě nezaměstnaných osob	
1	D	I.D.3.2	Komplexní opatření zaměřené na podporu tzv. tranzitních sociálních podniků	AP5
1	D	I.D.3.3	Zajistit plnění Usnesení vlády ČR č. 1127/2016	
1	D	I.D.3.4	Realizace opatření k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti	
1	D	I.D.3.5	Vzájemná spolupráce a koordinovaný přístup k dlouhodobě nezaměstnaným, zejména osobám v hmotné nouzi, v rámci útvarů ÚP ČR s cílem komplexně řešit situaci uchazečů o zaměstnání	
1	D	I.D.3.6	Realizovat a průběžně vyhodnocovat příspěvek na podporu regionální mobility	
1	D	I.D.4.1	Program zaměřený na rozvoj podnikavosti v počátečním vzdělávání	
1	E	I.E.1.1	Komplex opatření k řešení problematiky zadlužení jako jedné z příčin dlouhodobé nezaměstnanosti	
1	E	I.E.1.2	Komplex opatření k posílení a zefektivnění činnosti ÚP ČR ve strukturálně postižených krajích	
1	E	I.E.1.4	Analýza potenciálů stříbrné ekonomiky pro rozvoj Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje	
1	E	I.E.2.3	Rozvoj zdravotnické infrastruktury - Karlovy Vary	
1	E	I.E.4.1	Připravit regionální programy na podporu dalšího rozvoje již existujících místních kulturních institucí (muzea, divadla, orchestry, kulturní festivaly apod.) a na podporu vzniku nových kulturních institucí a aktivit ve všech třech krajích.	AP5
1	F	I.F.1.1	Akcelerační program na řešení sanace ekologických škod – závazky vyplývající z privatizačních smluv (kompetence MF ČR)	AP5
1	F	I.F.1.2	Přenasazení a posílení programu na sanaci ekologických škod financovaného z úrovně OP ŽP určeného pro města a obce – závazky nad rámec privatizačních smluv (kompetence MŽP)	AP5
1	F	I.F.1.3	Připravit návrh programu revitalizace / resocializace již dříve reaktivovaných ploch a území po těžbě	
1	F	I.F.1.4	Analýzovat existující programy v oblasti ŽP a stávající opatření na ochranu ŽP	

Aktuální opatření ve sledování		52
	Finalizace/Splněno	50
	Částečně splněno	9
	Problémy při realizaci	3
	Nutná iniciace realizace	8
	Rozpracováno	32
	Vyřazeno ze sledování	2
	Aktualizováno v jiném Akčním plánu	22

1	F	I.F.1.5	Akcelerace a urychlení čerpání alokace programu na řešení ekologických škod dle Usnesení vlády ČR č. 50/2002 Sb. na území Ústeckého a Karlovarského kraje	
1	F	I.F.1.6	Podpora programu Revitalizace Krušných hor (Ústecký i Karlovarský kraj)	
1	F	I.F.1.7	Akcelerace a urychlení čerpání alokace programu na řešení ekologických škod dle Usnesení vlády ČR č. 592/2002 Sb. na území Moravskoslezského kraje	
1	F	I.F.1.8	Analýza potenciálu a reálných možností využití přečerpávacích elektráren na území strukturálně postižených krajů	
1	F	I.F.2.1	Zhodnocení a případná úprava podmínek programu Demolice v sociálně vyloučených lokalitách vč. navýšení alokace tohoto programu	
1	F	I.F.2.2	Vznik programu zaměřeného na regeneraci brownfieldů v intravilánech měst a obcí s cílem jeho prostřednictvím podporovat nepodnikatelské využití regenerovaných ploch (kompetence MMR)	
1	F	I.F.2.3	Integrovaný Projekt celkové úpravy a využití prostor východního nádraží v Děčíně a budovy rakouské dráhy v jeho rámci	
1	F	I.F.2.4	Analýza rozvojových příležitostí a výsledů dosavadních rozvojových projektů města Terezín	
1	G	I.G.1.1	Komplex opatření k dobudování významných dopravních úseků – dálnic a silnic I. třídy	
1	G	I.G.1.3	Komplex opatření ke zkapacitnění a modernizaci železničních tratí	
1	G	I.G.1.5	Prodloužení a rozšíření vzletové a přistávací dráhy mezinárodního veřejného civilního letiště Karlovy Vary	
2	A	II.A.1.1	Podpora rozvoje podnikatelských aktivit ve strukturálně postižených regionech prostřednictvím investic do nemovitého majetku (bonifikace výzev OPPIK - Nemovitosti)	
2	A	II.A.2.1	Zvýšení hospodářského přínosu cestovního ruchu ve specifických lokalitách strukturálně postižených regionů	
2	B	II.B.2.1	Příprava programu zaměřeného na regenerace specifických brownfieldů ve městech a obcích směřujících k jejich dalšímu efektivnímu využití	AP5
2	C	II.C.2.2	Podpora vědecko-popularizačních činností na území strukturálně postižených krajů	
2	C	II.C.2.3	Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THETA	
2	D	II.D.2.1	Rozvoj multislužbových center celoživotního učení	
2	E	II.E.1.1	Podpora komunitního života a sociálních služeb	AP5
2	E	II.E.2.1	Podpora zdravotnictví ve strukturálně postižených regionech – obnova rozvoje materiálně-technické základny – část A	
2	E	II.E.2.2	Podpora zdravotnictví ve strukturálně postižených regionech – Systémové změny směřující k zajištění kvalifikovaného zdravotnického personálu – část B	
2	E	II.E.2.3	Podpora integrace zahraničních pracovníků	AP5 (E.2.2)
2	E	II.E.3.1	Podpora rozvoje venkovských oblastí ve strukturálně postižených regionech	
2	E	II.E.3.2	Komplexní obnova sídlišť	AP5 (E.3.1)
2	E	II.E.4.1	Navýšení alokace programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení, církví a náboženských společností, který má ve správě Ministerstvo kultury	
2	E	II.E.4.2	Navýšení alokace programu 134 130 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení spravovaných Ministerstvem kultury.	
2	E	II.E.4.3	Navýšení alokace Programu zachrany architektonického dědictví Ministerstva kultury a úprava zásad programu s ohledem na potřeby specifických nemovitých kulturních památek ve strukturálně postižených krajích	
2	F	II.F.1.1	Zlepšit kvalitu ovzduší	
2	F	II.F.1.2	Snížení nebezpečnosti provozu – Spolchemie	
2	F	II.F.1.3	Bezpečné kraje	
2	F	II.F.1.4	Adaptace území na dopady změny klimatu	
2	F	II.F.2.1	Odpadové hospodářství	AP5
2	G	II.G.1.2	Systémový přístup k plánování služeb související s kamionovou dopravou	
2	G	II.G.1.3	Napojení Podkrušnohorské výsypky u Sokolova na veřejnou dopravní infrastrukturu v Karlovarském kraji z důvodu umožnění její revitalizace	
2	G	II.G.2.1	Chytřejší Moravskoslezský kraj – ICT infrastruktura pro 21. století	AP4
3	A	III.A.1.1	Podpora poradenství a služeb na podporu podnikání a investorů (zejména s vyšší přidanou hodnotou)	AP5
3	B	III.B.2.1	Finanční nástroj JESSICA II. pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj	
3	B	III.B.2.2	Program na zajištění nabídky průmyslových ploch typu greenfield a zlepšování kvality a využitelnosti stávajících průmyslových zón	
3	C	III.C.2.1	Programy na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ve strukturálně postižených regionech	AP5
3	C	III.C.2.2	Podpora vysoce kvalifikovaných lidských zdrojů pro MSK, ÚK a KVK	
3	C	III.C.2.3	Specifická podpora výzkumu ve strukturálně postižených regionech	AP4
3	C	III.C.2.4	Podpora VaV infrastruktury	
3	D	III.D.1.1	Financování provozu regionálních pracovišť veřejných vysokých škol na území Karlovarského a Ústeckého kraje	
3	D	III.D.2.1	Podpora modernizace výuky a obnovy a rozvoje materiálně-technického zázemí škol a školských zařízení	AP4
3	D	III.D.2.2	Podpora rozvoje vysokého školství	AP5 (D.2.1)
3	E	III.E.2.1	Podpora rozvoje integrovaného záchranného systému	
3	E	III.E.3.1	Specifická podpora bydlení a bytové politiky	AP5
3	F	III.F.2.1	Odpadové hospodářství II	AP5

3	F	III.F.2.2	Specifické brownfieldy pro přípravu studií využitelnosti	
3	G	III.G.1.1	Dopravní napojení strategického významu ve strukturálně postižených regionech	
3	G	III.G.2.1	Příprava analýzy možností úpravy daňové soustavy pro zajištění rovnoměrného regionálního rozvoje České republiky	
4	A	IV. A.2.1	Podnikavý region (PODREG) - program na podporu začínajících podnikatelů, a potenciálních podnikatelských záměrů a MSP s vlastním produktem/službou	AP5
4	A	IV. A.3.1	Podpora digitalizace a robotizace především malých a středních firem prostřednictvím outsourcovaných služeb výzkumu, vývoje a poradenství	
4	A	IV. A.3.2	Rozvoj lázeňské infrastruktury a podpora lázeňství jako ekonomického odvětví v Karlovarském kraji	
4	C	IV. C.2.1	Specifická podpora výzkumu ve strukturálně postižených regionech	AP5
4	D	IV. D.2.1	Podpora modernizace výuky a obnovy a rozvoje materiálně-technického zázemí škol a školských zařízení	
4	D	IV. D.2.2	Komplex opatření rozvíjející kariérové poradenství a celoživotní vzdělávání v krajích	AP5 (D.2.1)
4	E	IV.E.4.1	Změna image strukturálně postižených regionů	
4	E	IV.E.4.2	Podpora kulturních a kreativních odvětví	
4	F	IV.F.1.1	Zpracování technickoekonomických analýz využitelnosti důlních děl v MSK	
4	F	IV.F.2.1	Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách – pokračování DT	
4	F	IV. F.2.2	Specifické brownfieldy pro přípravu studií využitelnosti	
4	F	IV. F.2.3	Program na podporu občanské vybavenosti a obslužnosti obcí ve strukturálně postižených regionech	
4	F	IV. F.3.1	Podpora komunitní energetiky ve strukturálně postižených regionech	
4	F	IV. F.3.2	Podpora zřízení Center veřejných energetik	
4	F	IV. F.3.3	Fond na přípravu strategických projektů do Fondu pro spravedlivou transformaci	
4	G	IV. G.1.1	Obnovení Slavkovské dráhy – studie proveditelnosti	
4	G	IV. G.2.1	Podpora rozvoje digitalizace státní správy a samosprávy, digitalizace služeb pro občany regionů	
5	A	V.A.1.1	Podpora rozvoje podnikatelských aktivit ve strukturálně postižených regionech prostřednictvím investic do nemovitého majetku	
5	A	V.A.1.2	Program na podporu modernizace technologií firem	
5	A	V.A.2.1	Podnikavý region (PODREG) - program na podporu začínajících podnikatelů či potenciálních podnikatelských záměrů	
5	B	V.B.2.1	Příprava programu zaměřeného na regeneraci specifických brownfieldů směřujících k jejich dalšímu efektivnímu využití	
5	C	V.C.1.1	Specifická podpora aplikovaného výzkumu a inovací pro strukturálně postižené regiony v rámci programu SIGMA	
5	C	V.C.2.1	Specifická podpora výzkumu ve strukturálně postižených regionech	
5	D	V.D.2.1	Komplex opatření rozvíjející kariérové poradenství, kariérové vzdělávání a příprav na zaměstnání v kontextu výzev spojených s transformací regionů	
5	D	V.D.3.1	Komplexní opatření zaměřené na podporu tzv. tranzitních sociálních podniků	
5	E	V.E.1.1	Podpora komunitního života	
5	E	V.E.2.2	Podpora integrace zahraničních pracovníků	
5	E	V.E.3.1	Komplexní obnova sídlišť (Specifická podpora bydlení a bytové politiky)	
5	E	V.E.4.1	Podpora živého umění, kulturních a kreativních odvětví ve strukturálně postižených krajích	
5	F	V.F.1.1	Přenasazení a posílení programu na sanaci ekologických škod financovaného z úrovně OP ŽP určeného pro města a obce – závazky nad rámec privatizačních smluv (kompetence MŽP)	
5	F	V.F.1.2	Adaptace území na dopady změny klimatu	
5	F	V.F.2.1	Přechod k oběhovému hospodářství	

AP	Pilíř	Číslo opatření	Název splněných opatření	Komentář k naplňování daného opatření
1	A	I.A.3.1	Podprogram programu TREND pro strukturálně postižené kraje	V 1.VS byla bonifikační kritéria. Proběhlo jednání k bonifikaci strukturálně postižených krajů v rámci přípravy 2.VS. Od 20.2.20 probíhá příjem žádostí do 2. veřejné soutěže (bez bonifikace pro strukturálně postižené regiony). Připravuje se 3. VS. Komentář 2024: V letech 2021-2023 bylo vyhlášeno několik soutěží v programu TREND s bonifikací pro strukturálně postižené regiony (PP1 - 6.VS, 10. VS, PP2- 4.VS, 9.VS.- viz tabulka Čerpání.Program TREND již dále nepokračuje.Opatření bylo naplněno.
1	B	I.B.2.1	Program na regeneraci a podnikatelské využití brownfieldů vč. navýšení alokace tohoto programu	3. výzva byla vyhodnocena, v návaznosti na výsledky proběhlo v KVK setkání se zástupci měst a obcí s prezentací příkladů úspěšných projektů a zkušeností s přípravou a nastavením projektů. 4.výzva vyhlášena, příjem žádostí do 31.8.2020, alokace 260 mil. Kč. MPO avizuje změny, jejich konkrétní rozsah a dopad na realizaci opatření nebyl NVT prezentován. NVT s ohledem na rostoucí zájem o tento program ze strany regionů doporučuje jej neměnit a realizovat ve stávajícím rozsahu.
1	C	I.C.1.1	Program zaměřený na podporu bilaterální spolupráce v aplikovaném výzkumu, včetně podpory přeshraničních projektů (Program DELTA2 – přímá návaznost na program DELTA)	V uplynulých VS prozatím nebylo aplikováno zvýhodnění uchazečů ze strukturálně postižených regionů. S TAČR vyjednaný jednotný postup pro VS programů TAČR – stanovení % na specifickou alokaci pro strukturálně postižené regiony v každé VS v členění 50:50 mezi NUTS II (hlavní uchazeč z ÚK, KVK či MSK). Prozatím není potřeba vyhlášovat specifické zvýhodnění, jelikož prostředků je v programu dostatek. Splněno (viz dohoda s TAČR o zvýhodnění v programech TAČR).
1	C	I.C.1.2	Program zaměřený na podporu technologického transferu, který by mohl do budoucna podporovat propojování lokálních inovativních MSP s výzkumnými organizacemi (Program GAMA2 – přímá návaznost na program GAMA)	Došlo k rozhodnutí, že v rámci GAMA 2 již nebude žádná veřejná soutěž. Dle aktuálních informací bude TA ČR usilovat o nový program. Zde bude NVT v této snaze TA ČR podporovat i s ohledem na realizaci tohoto opatření. Budou zahájena jednání s TA ČR na podporu pokračování programu. Splněno (viz dohoda s TAČR o zvýhodnění v programech TAČR).
1	C	I.C.1.3	Podpora bilaterální a multilaterální spolupráce v aplikovaném výzkumu (program EPSILON)	Dané opatření běží. V rámci 4. veřejné soutěže programu je realizováno 26 projektů s alespoň jedním účastníkem ze strukturálně postiženého regionu. Těmto účastníkům je poskytnuta podpora ve výši 126 mil. Kč. Od roku 2019 již nebyla vyhlášena žádná další národní veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích z důvodu schválení tří nových resortních programů, které mají podobné zaměření jako program EPSILON. Jedná se o Program TREND, Program Prostředí pro život a Program DOPRAVA 2020+. Na podporu VaVal v oblasti energetiky je specificky zaměřen program THĚTA. V současné době je program EPSILON využíván jako nástroj na podporu projektů z mezinárodních ERA-NET Cofund schémat, kde poskytnutí podpory projektům mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích probíhá na základě hodnocení a výběru projektů uskutečněného na mezinárodní úrovni.
1	C	I.C.1.9	Vytvoření Národní inovační platformy pro chemii (NIP VIII. Chemie)	NIP pro chemii je připravena v rámci aktualizace RIS 3, kdy termín jejího rozběhnutí je navázán na schválení RIS 3 ze strany vlády ČR.
1	C	I.C.2.1	Program na podporu aplikovaného společenskovo vědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (program ÉTA)	Dané opatření je realizováno. S TAČR vyjednaný jednotný postup pro VS programů TAČR - stanovení % na specifickou alokaci pro strukturálně postižené regiony v každé VS v členění na 50:50 mezi NUTS II (hlavní uchazeč z ÚK, KVK či MSK). Postup se vyjednává i pro programy administrované TAČR. 5. VS - podáno 69 projektů s hlavním uchazečem z regionů (ÚK - 23, KVK - 2, MSK - 44), specifická alokace pro ÚK, KVK a MSK ve výši 20 mil. Kč pro návrhy projektů, ve kterých měl uchazeč sídlo v daném regionu - podpořeno projektů: ÚK - 4, KVK - 0, MSK - 5. Přidělená dotace: ÚK 16 949 550 Kč, KVK - 0, MSK - 16 523 547 Kč. Dále 4. VS - ÉTA Covid bez zvýhodnění, 3. VS - podáno 72 projektů s hlavním uchazečem z regionů, podpořeno 8 projektů. Komentář 2024: V 5.VS bylo podpořeno 59 projektů z ÚK a MSK ve výši 33, 4 mil. Kč.
1	C	I.C.2.3	Program získávání expertů pro krajskou VaV excelenci	Výzva ukončena 31.1.2020. Strukturálně postižené kraje dostaly možnost využít na realizaci svých projektů o 20 mil. Kč více oproti ostatním regionům, tzn. alokace pro MSK 60 mil. Kč, alokace pro ÚK a KVK 45 mil. Kč. Realizace twinningu se zatím stále rozbíhá.
1	C	I.C.2.5	Testování autonomních silničních vozidel v reálném (nebo téměř reálném) silničním provozu města Ústí nad Labem - U "SMART" ZONE	Opatření naplněno, zafinancovaná analýza byla v 1.Q 2019 zveřejněna. Na výstupy této analýzy pak navazují další aktivity města a kraje, kteří na praktickém využití výstupů této studie spolupracují. Připravují výzkumné projekty v této oblasti. V návaznosti na výstupy této studie bylo také do AP3 zahrnuto opatření v pilíři C jako opatření návazného charakteru umožňující uvedení výstupů studie do praxe. V této věci se také vedou úzká jednání s MD k podpoře aktivit, které spadají do gesce tohoto resortu. V návaznosti na výstupy této analýzy se podařilo také iniciovat přípravu dalších výzkumných projektů v regionu aktuálně podaných do programu Doprava 2020+, dojednávání realizace Mobility Innovation Hubu. V červenci 2019 podepsáno Memorandum o spolupráci mezi ÚK a městem ÚL, koordinaci aktivit převzal kraj, částečně i prostřednictvím ICUK. Poslední jednání proběhla v říjnu a prosinci 2021, v lednu 2022 se chystalo Memorandum o partnerství a spolupráci při rozvoji kooperativní, propojené a automatizované mobility v ÚK, na základě toho kdo přistoupil by měla fungovat platforma CCAM.

1	D	I.D.1.1	Komplexní opatření „Regionální talent management“ - zvýšení atraktivity krajů pro život obyvatel a rozšíření nabídky perspektivních pracovních a kariérních vyhlídek pro mladé a kvalifikované odborníky	V roce 2022 byly projekty I KAP II v dotčených regionech v plné realizaci (realizace projektů I KAP II v ÚK duben 2020–březen 2023, v KVK září 2020–srpen 2023 a MSK červenec 2020–listopad 2023).
1	D	I.D.1.3	Cílené komplementární výzvy z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro VŠ ve strukturálně postižených regionech	Výzva s alokací 2,2 mld. Kč byla vyhlášena a ukončena v průběhu roku 2018. Celkově došlo k rozdělení 2,17 mld. Kč v rámci 11 podpořených projektů, jeden žadatel odmítl dotaci na svoji žádost ve výši 15 mil. Kč.
1	D	I.D.2.1	Komplex opatření rozvíjející kariérové poradenství a celoživotní vzdělávání v krajích	V roce 2022 byly projekty I KAP II v dotčených regionech v plné realizaci (realizace projektů I KAP II v ÚK duben 2020–březen 2023, v KVK září 2020–srpen 2023 a MSK červenec 2020–listopad 2023).
1	D	I.D.2.2	Program „Yes, I do“ - zlepšení komunikace v anglickém jazyce u absolventů základních a středních škol	V roce 2022 byly projekty I KAP II v dotčených regionech v plné realizaci (realizace projektů I KAP II v ÚK duben 2020–březen 2023, v KVK září 2020–srpen 2023 a MSK červenec 2020–listopad 2023).
1	D	I.D.2.3	Program zaměřený na přípravu zaměstnanců pro moderní průmyslové firmy (vzdělávání 4.0 a práce 4.0 pro průmysl 4.0)	V roce 2022 byly projekty I KAP II v dotčených regionech v plné realizaci (realizace projektů I KAP II v ÚK duben 2020–březen 2023, v KVK září 2020–srpen 2023 a MSK červenec 2020–listopad 2023).
1	D	I.D.2.4	Rozvoj predikčního systému trhu práce prostřednictvím projektu KOMPAS	Opatření naplněno, je potřeba jej pouze sledovat a vyhodnocovat jeho účinnost v dlouhodobém časovém horizontu v rámci příslušných platform v jednotlivých krajích.
1	D	I.D.2.5	Realizace projektů PIPS (Podpora informačních a poradenských středisek) a EFES (efektivní služby zaměstnanosti)	Oba projekty jsou průběžně realizovány - projekt EFES by měl být ukončen 31.8.2020, projekt PIPS pak bude realizován až do 31.12.2021. Bude potřeba sledovat a vyhodnocovat jeho účinnost v dlouhodobém časovém horizontu v rámci příslušných platform v jednotlivých krajích. Komentář RESTART 01/2024: Projekt EFES byl prodloužen do 30.11.2023, nyní jsou již oba projekty ukončeny. Opatření naplněno.
1	D	I.D.2.6	Intenzivní využívání NSP v činnosti ÚP ČR (zprostředkování, poradenství, rekvalifikace)	Opatření je realizováno ze strany Úřadu práce ČR.
1	D	I.D.2.7	V souladu se zákonnými postupy při zadávání veřejných zakázek bude ÚP ČR při výběru dodavatelů poradenských služeb akceptovat nabídky a aktivně oslovovat řemeslné inkubátory	Opatření je realizováno ze strany Úřadu práce ČR.
1	D	I.D.2.8	Intenzifikace využití zvolené rekvalifikace – cílené využívání ustanovení § 109a Zákona o zaměstnanosti	Opatření je realizováno ze strany Úřadu práce ČR.
1	D	I.D.2.9	Zpracování analýzy možnosti zavedení podpory v rekvalifikaci i v případě § 109a Zákona o zaměstnanosti	Ze strany MPSV bylo potvrzeno naplnění tohoto opatření
1	D	I.D.2.10	Realizace stávajících preventivních opatření v MSK a vyhodnocení jejich účinnosti na cílovou skupinu	Cíle již byly splněny působením pozitivního vývoje na trhu práce. Z důvodu toho, že ve firmách nedochází k hromadnému propouštění v takové míře jak se očekávalo v roce 2016 (kdy byl tento projekt schválen k realizaci), bylo rozhodnuto, že doba realizace projektu již nebude prodloužena a projekt skončí podle plánu, tj. k 31.12.2019.
1	D	I.D.2.11	Zpracování analýzy možnosti vytvoření nových či přizpůsobení stávajících nástrojů podporujících přizpůsobení podniků a jejich zaměstnanců technologickým změnám v prostředí 4. průmyslové revoluce při zachování maximální možné míry zaměstnanosti	Ze strany MPSV bylo potvrzeno naplnění tohoto opatření.
1	D	I.D.3.1	Program „Krok za krokem na trh práce“ – rozvoj zaměstnatelnosti dlouhodobě nezaměstnaných osob	Opatření je plněno. ÚP ČR připravil k realizaci projekt "Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání". Projekt je v realizaci od ledna 2019 a obsahuje jednotlivé aktivity směřující k podpoře integrace dlouhodobě nezaměstnaných osob na trh práce. Aktivity se skládají z poradenství, rekvalifikací, tzv. práce na zkoušku a podpory vytváření pracovních míst. Zároveň přistupuje ÚP ČR komplexně k osobám, které se ocitnou v hmotné nouzi, a to prostřednictvím spolupráce útvarů zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek. Nutná aktivizace v některých dílčích opatřeních. Splněno - realizován celostátní projekt Podpora dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů o zaměstnání. (2/22)
1	D	I.D.3.3	Zajistit plnění Usnesení vlády ČR č. 1127/2016	Plněno. Pravidelně vládě ČR předávána informace o stavu plnění jednotlivých opatření. Je nutné průběžně sledovat. Komentář 02/2022: Splněno. Poslední zpráva za období 2. poloviny 2019 a 1. poloviny 2020 byla předložena vládě pod č.j. OVA: 1263/20 dne 2. listopadu 2020. Ze 17 opatření bylo 16 splněno, poslední opatření týkající se rekvalifikací bylo řešeno.

1	D	I.D.3.4	Realizace opatření k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti	V rámci průběžné realizace aktuálně MPSV doporučuje sloučit toto opatření s I.D.3.1. K řešení dlouhodobé nezaměstnanosti připravil ÚP ČR k realizaci projekt s názvem „Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání“ (PDU). Projekt byl zahájen v lednu 2019 a obsahuje mnoho cílených aktivit směřujících k podpoře integrace dlouhodobě nezaměstnaných osob na trhu práce. Jedná se nejen o odborné poradenství, nabídku vhodných rekvalifikací, ale i o tzv. práce na zkoušku a podpory vytváření nových pracovních míst. Pro skupinu osob se zdravotním postižením (OZP) ÚP ČR připravil projekt s názvem „OZP“, v jehož rámci vznikl „Poradenský program pro OZP“, který je realizován již od poloviny roku 2018. Aktivita tohoto programu jsou zaměřeny na poradenství z mnoha oblastí, přičemž cílem programu je konkrétní pomoc OZP např. orientovat se v dostupných nástrojích APZ, v nástrojích sociálního zabezpečení, v oblasti pracovní rehabilitace, ale i možnosti řešení individuálních potřeb osob s handicapem. Prioritou je zvýšená péče uchazečů o zaměstnání (OZP) při umísťování zvláště na volném trhu práce. Na tuto skupinu je také zaměřena tzv. Pracovní rehabilitace, která zahrnuje komplex aktivit a činností zaměřených na získání a udržení vhodného zaměstnání pro OZP. Patří sem poradenské činnosti (bilanční a pracovní diagnostika, ergodiagnostika, Job cluby a Poradenský program pro OZP), dále příprava na povolání, příprava k práci, specializované rekvalifikační kurzy a zvýšená péče s individuálním přístupem při zprostředkování zaměstnání.
1	D	I.D.3.5	Vzájemná spolupráce a koordinovaný přístup k dlouhodobě nezaměstnaným, zejména osobám v hmotné nouzi, v rámci útvarů ÚP ČR s cílem komplexně řešit situaci uchazečů o zaměstnání	Opatření je fakticky již naplňováno prostřednictvím platných vnitřních řídicích aktů Úřadu práce ČR, které upravují spolupráci útvarů NSD a ZAM v rámci ÚP ČR při práci s klienty, kteří jsou uchazeči o zaměstnání a zároveň osobami v hmotné nouzi. MPSV jej doporučuje označit za splněné.
1	D	I.D.3.6	Realizovat a průběžně vyhodnocovat příspěvek na podporu regionální mobility	Naplněno.
1	D	I.D.4.1	Program zaměřený na rozvoj podnikavosti v počátečním vzdělávání	V roce 2022 byly projekty I KAP II v dotčených regionech v plné realizaci (realizace projektů I KAP II v ÚK duben 2020–březen 2023, v KVK září 2020–srpen 2023 a MSK červenec 2020–listopad 2023).
1	E	I.E.1.4	Analýza potenciálu stříbrné ekonomiky pro rozvoj Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje	Analýza hotová, aktuálně se řeší podněty k jejím výstupům a jejich větší přenositelnost k řešení specifík jednotlivých regionů.
1	E	I.E.2.3	Rozvoj zdravotnické infrastruktury - Karlovy Vary	V roce 2022 byla: ve spolupráci s Karlovarskou krajskou nemocnicí intenzivně a opakovaně řešena dostupnost komplexní onkologické péče pro pacienty z Karlovarského kraje. Zajištění její dostupnosti se stalo i jedním z cílů přijatého Národního onkologického plánu České republiky 2030. Dále byla zřízena Ministerstvem zdravotnictví Traumacentra II. typu z důvodu zajištění traumatologické péče v regionech, kde není zajištěna dostupnost těchto služeb, včetně Karlovarského kraje. V roce 2022 prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 byla ze strany Ministerstva pro místní rozvoj vyhlášena výzva (na základě podnětů Mzd) v podpoře následné lůžkové péče zacílena na Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Zlínský, Olomoucký nebo Moravskoslezský kraj. V této výzvě je podpora nových poskytovatelů možná a bonifikovaná vyšší částkou dotace právě na území Karlovarského, Ústeckého, Zlínského a Libereckého kraje.
1	F	I.F.1.5	Akcelerace a urychlení čerpání alokace programu na řešení ekologických škod dle Usnesení vlády ČR č. 50/2002 Sb. na území Ústeckého a Karlovarského kraje	Opatření splněno, naplňování je otázkou vyhlášení a realizace veřejných zakázek. Proběhlo navýšení alokace a vyhlášené výběrové řízení zatím běží na dokončení projektů v rámci původní alokace. Ročně by měly být vyčleněny cca 2 mld. Kč. Nedochozí však k naplňování harmonogramu opatření. Opatření je splněno z pohledu navýšení alokace, ale nikoliv z pohledu plnění časového harmonogramu. Vláda ČR prosadila, že se vyloučí sanační a rekultivační projekty a snížil se počet projektů na 10 společně s MSK z původních 13 za rok. Toto se tedy v rámci opatření moc nedaří a předpokládáme dělení 5/5 projektů mezi UK+KVK a MSK.
1	F	I.F.1.6	Podpora programu Revitalizace Krušných hor (Ústecký i Karlovarský kraj)	Opatření plněno průběžně. Výzvy v programu jsou průběžně vyhlášovány zejména v oblasti obnovy lesních porostů a zajištění jejich vápnění. Ze strany Mze bude v roce 2019 zahájeno periodické hodnocení daného programu. V rámci oddělení ochrany lesa došlo k internímu vyhodnocování podkladů za roky 2017 - 2020, souhrnné údaje byly poskytnuty formou emailu dne 11.2. 2022.
1	F	I.F.2.1	Zhodnocení a případná úprava podmínek programu Demolice v sociálně vyloučených lokalitách vč. navýšení alokace tohoto programu	Opatření splněno. V listopadu 2019 vyhlášena výzva č. 3 opět s alokací cca 100 mil, příjem žádostí ukončen 14.2.2020. Kč. S ohledem na poptávku z regionu bylo v rámci AP4 navrženo pokračování tohoto dotačního titulu - opatření IV.F.2.1.
1	F	I.F.2.2	Vznik programu zaměřeného na regeneraci brownfieldů v intravilánech měst a obcí s cílem jeho prostřednictvím podporovat nepodnikatelské využití regenerovaných ploch (kompetence MMR)	Opatření splněno. Proběhlo hodnocení 1. výzvy, kde byl značný převis. Ze strukturálně postižených krajů bylo podpořeno 6 projektů s předpokládanou dotací 65 mil. Kč. Celkově lze výzvu č. 1 označit jako neúspěšnou z pohledu strukturálně postižených krajů. V prosinci 2019 vyhlášena výzva č.2 s předpokládanou alokací cca 200 mil. Kč, příjem žádostí do 11.5.2020. V poslední výzvě podpořeno 9 projektů, přidělená dotace 219 mil. Kč. Dne 1.6.2022 byly vyhlášeny výzvy z programu Brownfieldy (SFPI), výzva č. 1 byla se specifickou alokací 200 mil. Kč. pro ÚK, MSK, KVK.
1	F	I.F.2.3	Integrovaný Projekt celkové úpravy a využití prostor východního nádraží v Děčíně a budovy rakouské dráhy v jeho rámci	Město Děčín uspělo se žádostí o podporu zpracování rozvojové studie v rámci specifického programu MMR.
1	F	I.F.2.4	Analýza rozvojových příležitostí a výsledů dosavadních rozvojových projektů města Terezín	Město Terezín uspělo se žádostí o podporu zpracování rozvojové studie.

1	G	I.G.1.1	Komplex opatření k dobudování významných dopravních úseků – dálnic a silnic I. třídy	Obecně se daří naplňovat úseky v souladu s DSS, na území regionů byly ve finančním výhledu do konce roku 2018 akce za 3,9 mld. Kč. Vyhodnocení roku 2019 lze udělat až po vyhodnocení realizace dopravních staveb cca v březnu 2020.
1	G	I.G.1.3	Komplex opatření ke zkapacitnění a modernizaci železničních tratí	Obecně sledovat naplňování dlouhodobých DSS v gesci MD na území regionů. Cílem opatření je primárně projektová příprava vybraných úseků či jejich modernizace.
2	A	II.A.1.1	Podpora rozvoje podnikatelských aktivit ve strukturálně postižených regionech prostřednictvím investic do nemovitého majetku (bonifikace výzev OPPIK - Nemovitosti)	Opatření se podařilo naplnit. Celkem bylo podpořeno 42 projektů ve výši cca 814 mil. Kč.
2	A	II.A.2.1	Zvýšení hospodářského přínosu cestovního ruchu ve specifických lokalitách strukturálně postižených regionů	Stávající Národní program podpory cestovního ruchu v regionech umožňuje realizaci projektů zaměřených na rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu – realizované projekty přispívají k rozvoji potenciálu cestovního ruchu v regionech i zvýšení konkurenceschopnosti regionů jako destinací cestovního ruchu. Program je realizován na principu regionalizace, to znamená, že alokace programu je rozdělena mezi jednotlivé kraje. Každý kraj, má tak v podstatě stanovenou vlastní obálku. Navíc projekty realizované na území strukturálně postižených regionů, respektive HSOÚ jsou v rámci hodnocení bodově zvýhodněny.
2	C	II.C.2.3	Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA	Program THÉTA - v roce 2018 byla ukončena 3. veřejná soutěž. Dále byla vyhlášena v roce 2021 již 4. veřejná soutěž, ve které bylo podpořeno 12 projektů ze strukturálně postižených regionů. V roce 2022 byla vyhlášena 5. veřejná soutěž, podpořeny projekty ve výši přes 88 mil. Kč.
2	E	II.E.2.1	Podpora zdravotnictví ve strukturálně postižených regionech – obnova rozvoje materiálně-technické základny – část A	MZ spolupracovalo a průběžně spolupracuje s MMR (operační programy financované z EU fondů) na vyhlášení výzev IROP 2014–2020 a 2021–2027. Nástroj REACT-EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014–2020, který reagoval na pandemii covid-19, umožnil získat krajským i okresním nemocnicím (zejména urgentních příjmů I. a II. typu) dotace v řádu stamilionů (např. Karlovarská krajská nemocnice a.s. – Karlovy Vary, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí n. L. a Fakultní nemocnice Ostrava) mohly získat až 500 mil. Kč, urgentní příjmy II. typu (tj. většina okresních nemocnic) až 150 mil. Kč. Tyto rozsáhlé projekty jsou nyní v realizaci a měly by být dokončeny do konce roku 2023. V rámci IROP 2021–2027 se připravují do podpory výstavby a modernizace urgentních příjmů.
2	E	II.E.2.2	Podpora zdravotnictví ve strukturálně postižených regionech – Systémové změny směřující k zajištění kvalifikovaného zdravotnického personálu – část B	Projekty zaměřené na digitalizaci zdravotnictví jsou uvedeny na portálu Národního centra elektronického zdravotnictví – viz záložky Projekty a Národní plán obnovy.
2	G	II.G.1.3	Napojení Podkrušnohorské výsypky u Sokolova na veřejnou dopravní infrastrukturu v Karlovarském kraji z důvodu umožnění její revitalizace	Dané opatření se podařilo naplnit a příprava realizace dále probíhá. Došlo k zahájení stavby dne 19. 9. 2019. Nejnižší nabídku podala společnost Strabag s cenou 73,7 mil Kč s DPH. Naplněna byla pouze první fáze, na schválení financí pro fázi druhou se čeká - předpoklad schválení jaro 2022. OPŽP 2021-2027, v rámci Specifického cíle 1.5 – Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje, OPŽP 2021-2027 je připravena dotační podpora pro celou oblast odpadového a oběhového hospodářství. Celková alokace na podporu přechodu na oběhové hospodářství je na programové období OPŽP 2021-2027 cca 7,1 mld. Kč.
3	F	III.F.2.2	Specifické brownfieldy pro přípravu studií využitelnosti	V listopadu 2019 byla vyhlášena 2. výzva umožňující přípravu a tvorbu studií využitelnosti pro specifické brownfieldy na území Karlovarského kraje: Obec Velká Hleďsebe – areál bývalých kasáren armády ČR, Obec Skalná – areál bývalého státního statku, Karlovy Vary – areál bývalé vodárny. Na území MS kraje: Frýdek – Místek – Kasárna Palkovická, Opava – Dukelské kasárny, Ostrava - Rozvojová plocha mezi DOV a Karolínou. Na území Ústeckého kraje: Teplice – Lokalita Teplického nádraží a Městské lázně v Chomutově. Výzva ukončena 14.2.2020. Ze strany MMR bylo na poradním týmu umožněno regionům v rámci aktualizace opatření v AP4 definovat 1 další specifický BF. Na území Ústeckého kraje: Žatec - Dreherův pivovar, na území MS kraje : Frýdek-Místek - Areál bývalých válcoven ACM a Služovice - bývalá kasárna, na území KVK - Areál železničního depa - město Sokolov".
4	A	IV. A.3.1	Podpora digitalizace a robotizace především malých a středních firem prostřednictvím outsourcovaných služeb výzkumu, vývoje a poradenství	V 1.VS byla bonifikační kritéria. Proběhlo jednání k bonifikaci strukturálně postižených krajů v rámci přípravy 2.VS. Od 20.2.20 probíhá příjem žádostí do 2. veřejné soutěže (bez bonifikace pro strukturálně postižené regiony). Připravuje se 3. VS. Komentář 2024: V letech 2021-2023 bylo vyhlášeno několik soutěží v programu TREND s bonifikací pro strukturálně postižené regiony (PP1 - 6.VS, 10. VS, PP2- 4.VS, 9.VS.- viz tabulka Čerpání.Program TREND již dále nepokračuje.
4	F	IV.F.2.1	Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách – pokračování DT	V roce 2021 vyhlášena výzva programu Podpora revitalizace území - dotační titul DT 1 byl určen pouze pro žadatele ležící na území MSK, ÚK a KVK. Výsledky zveřejněny v březnu 2022, celková přidělená dotace schváleným projektům ve výši 23,8 Kč. Dále budou Demolice budov v SVL v dalších letech součástí DT v rámci programů vyhlašovaných SFPI. Výzva pro rok 2022 vyhlášena k 20.6.2022, celkem podpora ve výši 10 mil. Kč. Výzva pro rok 2023 byla vyhlášena k 15.2.2023 a podpořeny projekty ve výši 11,5 mil. Kč.
4	F	IV. F.2.2	Specifické brownfieldy pro přípravu studií využitelnosti	V roce 2021 vyhlášena výzva MMR v programu Podpora revitalizace území podprogramu Tvorba studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů s alokací výzvy 8 mil. Kč. Do výzvy se přihlásili 2 uchazeči - město Žatec a obec Služovice, oba projekty byly podpořeny, každý částkou 2.000.000 Kč, studie jsou již hotovy.

4	F	IV. F.3.3	Fond na přípravu strategických projektů do Fondu pro spravedlivou transformaci	V průběhu podzimu roku 2021 byla ze strany SFŽP vyhlášena výzva na podporu projektové přípravy strategických projektů. Dále se připravují další nástroje na podporu projektové přípravy mimo jiné v rámci OPST, NPO, ale také jsou zahájeny diskuze s EIB o větším rozšířeném poradenství v oblasti přípravy projektů nejen pro OPST, ale i do dalších zdrojů. Komentář RESTART 02/2024: 16.11.2021 byla vyhlášena výzva na Podporu na předprojektovou přípravu strategických projektů v rámci implemetace MST s alokací 170 mil. Kč., další Výzva na Technickou pomoc v OPST pro předkládání žádostí o podporu směřující k efektivní administraci projektů OPST je v platnosti od 9.12.2022 do 31.12.2029, s alokací 1,5 mld Kč.
5	D	V.D.3.1	Komplexní opatření zaměřené na podporu tzv. tranzitních sociálních podniků	Komentář MPSV 04/2024 - opatření již bylo splněno: 1) Vyhlášením průběžné výzvy „Podpora sociálního podnikání (1)“ v letech 2022 až 2024 na podporu sociálního podnikání v rámci SC 2.1 OPZ+. 2) Spuštěním programu S-podnik: PROGRAM S-PODNIK PLUS - www.esfcr.cz , příjem žádostí od 1. 4. 2024. 3) Podporou projektu „Tranzitní místa v sociálních podnicích v MSK+“ (24,7 mil Kč), realizátor Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s. 4) Podporou dalších projektů v rámci soutěžních výzev SC1.1 OPZ+ na podporu zaměstnanosti znevýhodněných osob: Ve výzvě pro ITI: a) Ústí-Chomutov: 4 projekty – 53,8 mil Kč b) Karlovy Vary: 2 projekty – 15,6 mil Kč c) Ostrava: 1 projekt – 5,9 mil Kč (+ výše uvedená „Tranzitní místa“) Ve výzvách č. 19, 52 a 56: d) Ústecký kraj: 22 projektů – 153,6 mil Kč e) Karlovarský kraj: 2 projekty – 10,1 mil Kč f) Moravskoslezský kraj: 15 projektů – 82,1 mil Kč

F	F.1	I.F.1.6	Podpora programu Revitalizace Krutných hor (Ústecký / Katovský kraj)	UK, KVK	MZe	MŽP	2017-2030	Finalizace/Spínáno	Vláda ČR v součinnosti s plněním Programu revitalizace Krutných hor (schváleného usnesením vlády ČR ze dne 23. 11. 2016 č. 1031, dále jen „Program“) pověřuje ministra zemědělství a ministra životního prostředí v součinnosti s Úřadem vládního zmocněním vyhodnocovat míru a efektivitu využití dostupných dotačních titulů v gesci jednotlivých uvedených ministerstev vyuzítelných k plnění cílů Programu. V případě potřeby navrhovat následně pro zvýšení míry čerpání dostupných dotačních zdrojů a pro zjištění problematiky a administrace dotací zejména vlastním jasně malých vnitřním žadatelům (obcí).	Opáření přehled průběžně. Výzvy v programu jsou průběžně vyhlašovány zejména v oblasti obnovy lesních porostů a zajištění jejich udržitelnosti. Ze strany MZe bude v roce 2019 zahájeno periodické hodnocení daného programu. Aktuálně probíhá v rámci oddělení ochrany lesa k internímu vyhodnocování podkladů za čtyři roky 2017 - 2020, souhrnné údaje nám byly poskytnuty formou emailu dne 11.3.2022. (202022)	
F	F.1	I.F.1.7	Akcelerace a urychlení čerpání alokace programu na řešení ekologických škod dle Úpravení vlády ČR č. 892/2002 Sb. na území Moravskoslezského kraje	MSK	MF	MPO	2017-2023	Rozpracováno	Vláda ČR ukládá 1. Ministerstvu podniku a ministerstvu zemědělství a obchodu zajistit urychlení procesu zadávání veřejných zakázek ve smyslu zákona č. 180/2016 Sb. s cílem akcelerace čerpání prostředků na realizaci projektů dle bodu II.3. usnesení vlády č. 546/2016. 2. Ministerstvu zemědělství a obchodu ve spolupráci s ministerstvem financí zpracovat návrh postupu pro revizi absorpční kapacity a potřeby Moravskoslezského kraje řešení ekologických škod dle Úpravení vlády č. 892/2002 Sb. Vyplývající ze směrné alokace o 6 mld. včetně revize dostupnosti financování z privatizačních výnosů, případně alternativních národních zdrojů a tento návrh předložit vládě do 31. 12. 2017.	Ročně by měly být vyhlášeny 2 mld. Kč na financování projektů z čou kraje. Aktivita však stojí na vyhlášení veřejných zakázek ze strany MF. Z MSK žádost na MF - o shnutí aktuálního stavu ale je potřeba ještě doložit podobu reportování implementace, jednání se zástupci MF probíhá v prosinci 2019. Ze strany MSK probíhá revize projektů, které prošly schválením v meziresortní komisi a byla nastavena kritéria pro kritické prioritizaci. Ze strany MPO byl MSK požádán o stanovení 5 prioritních projektů pro harmonogram zadávání na rok 2020 a o sledování vývoje. Akcelerace čerpání naplňují na pomalé tempo vyhlášení veřejných zakázek ze strany MF. Je-li pomalé tempo vyhlášení, jaké jsou jeho konkrétní příčiny? (10/2021)	
F	F.1	I.F.1.8	Analýza potenciálu a reálných možností využití přepravních elektrár na území strukturálně postižených krajů	Nadregionální	MPO		2018-2022	Iniciace	Vláda ČR ukládá ministerstvu zemědělství a obchodu zajistit zpracování podrobné analýzy potenciálu výstavby a reálných možností využití přepravních elektrár na území strukturálně postižených krajů. Termín: 12/2018	Opáření je realizováno zatím pouze dílčími kroky ze strany Palckového kombinátu Ústí, s.p., který v letošním roce dokončil stavbu výhledu se možností využití hydrodynamické rekultivace na území UK a tomuto účelu. Pro naplnění opáření je však důležitá obdobná kroky realizovat i pro ostatní typy důlních děl v ostatních regionech. V těchto realizovatelných schůzce se zástupci MPO a předána Analýza potenciálu PVE. Opáření se tímto posunulo, ale stále ještě není naplněno. Písemně se následně řešení pro zajištění řešení regionálního hlediska, které v analýze nezohledňuje aktuální trendy a vývoj ukončení lážby. Komentář: 10/2021 - nejsou veřejně dostupné podkladní analýzy. Komentář: MPO 01/2024. Žádná není realizována.	
F	F.2	I.F.2.1	Zhodnocení a případná úprava podmínek programu Demolice v sociálně vyloučených lokalitách vč. navýšení alokace tohoto programu	Nadregionální	MMR	MF	2018-2021	Finalizace/Spínáno	Vláda ČR ukládá ministerstvu pro místní rozvoj i. provést do 31. 5. 2018 analýzu dotačního titulu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách a na základě výsledků analýzy upravit pravidla dotačního titulu pro období 2019-2021. II. vyhlášení dotační titulu Demolice v sociálně vyloučených lokalitách v období 2019-2021 ukládá ministerstvu pro místní rozvoj ve spolupráci s ministerstvem financí zajistit financování dotačního titulu v období 2019-2021 ve výši 100 mil. Kč ročně.	Komentář: 01/2021 - Opáření splněno. V listopadu 2019 vyhlášena výzva č. 3 opět s alokací cca 100 mil, přičemž žádosti ukončen 14.2.2020. Kč. S ohledem na podklady z regionu bylo v rámci AP4 navrženo pokračování tohoto dotačního titulu - opáření IV.F.2.1.	
F	F.2	I.F.2.2	Vznik programu zaměřeného na regeneraci brownfieldů v intravilánech měst a obcí s cílem jeho prostřednictvím podporovat neproduktivní využití regenerovaných ploch (kompetence MMR)	Nadregionální	MMR		2019-2021	Finalizace/Spínáno	Vláda ČR ukládá ministerstvu pro místní rozvoj i. zpracovat do 31. 5. 2018 zásady dotačního titulu na regeneraci brownfieldů v intravilánech obcí pro další neproduktivní využití. II. ukládá ministerstvu pro místní rozvoj ve spolupráci s ministerstvem financí zajistit financování dotačního titulu v období 2019-2021 ve výši 200 mil. Kč ročně ukládá ministerstvu pro místní rozvoj III. navýšit systémovou Ministerstva pro místní rozvoj o 3 systémovou míru z zajištění přípravy nových dotačních titulů	Opáření splněno. Probíhá hodnocení 1. výzvy, kde byl značný převah. Ze strukturálně postižených krajů bylo podpořeno 6 projektů s předpokládanou dotací 65 mil. Kč. Celkové lze výzvu č. 1 označit jako neúspěšnou z pohledu strukturálně postižených krajů. V prosinci 2019 vyhlášena výzva 2.2 s předpokládanou alokací cca 200 mil. Kč, přičemž žádosti do 11.5.2020. V poslední výzvě podpořeno 9 projektů, přičemž dotace 219 mil. Kč. Zbývá pokračování v AP4, souhrnné vyhodnocení přehledných výzev (10/2021). Aktuálně, dne 14.2.2022, vyhlášeny výzvy z programu Brownfieldy (SFP), přičemž výzva č. 1 je specifická výzva s alokací 200 mil. Kč pro UK, MSK a KVK.	
F	F.2	I.F.2.3	Integrovaný Projekt celkové úpravy a využití prostor výtvarného nádraží v Olšové a budovy rakouské dráhy v jeho rámci	UK	MMR		2017-2023	Finalizace/Spínáno	Vláda ČR ukládá ministerstvu pro místní rozvoj přípravit dotační titul pro financování ovlivňovacích studií a analýz možností využití revitalizačních území v rámci dotačního programu zaměřeného na regeneraci brownfieldů v intravilánech obcí pro další neproduktivní využití revitalizačních ploch, kdy oprávněným žadatelem bude konkrétní subjekt navržený a schválený vládou.	Město Dačín uspělo se žádostí o podporu zpracování rozvojové studie v rámci specifického programu MMR	
F	F.2	I.F.2.4	Analýza rozvojových příležitostí a výsledků dosavadních rozvojových projektů města Terezní	UK	MMR		2017	Finalizace/Spínáno	Vláda ČR ukládá ministerstvu pro místní rozvoj přípravit dotační titul pro financování ovlivňovacích studií a analýz možností využití revitalizačních území v rámci dotačního programu zaměřeného na regeneraci brownfieldů v intravilánech obcí pro další neproduktivní využití revitalizačních ploch, kdy oprávněným žadatelem bude konkrétní subjekt navržený a schválený vládou.	Město Terezní - uspělo se žádostí o podporu zpracování rozvojové studie	
G	G.1	I.G.1.1	Komplex opáření k dobudování významných dopravních úseků – dálnice a silnic I. třídy	Nadregionální	MD		2017-2030	Finalizace/Spínáno	Vláda ČR pověřuje ministra dopravy ve spolupráci se Společnou fondem dopravní infrastruktury zajistit dostatečné prostředky na plánované práce a naplňování plánovanou dopravní stavby podle bodu II.3. usnesení vlády č. 546/2016 pro rok 2018.	Obecně se dal naplnit úsek v součinnosti s DSS, na území regionu byly ve finančním výhledu do konce roku 2018 akce za 3,9 mld. Kč. Vyhodnocení roku 2019 lze udlát až po vyhodnocení realizace dopravních staveb cca v březnu 2020.	
G	G.1	I.G.1.3	Komplex opáření ke zmodernizaci a modernizaci železničních tratí	Nadregionální	MD		2017-2035	Finalizace/Spínáno	Vláda ČR pověřuje ministra dopravy ve spolupráci se Společnou železniční dopravní cestou zajistit dostatečné prostředky na plánované práce a naplňování plánovaných staveb – dopravních v příloze láto file. Dále určitelné přípravných prací na dotčených tratích.	Obecně sledovat naplňování dlouhodobých DSS v gesci MD na území regionu. Cílem opáření je primárně projektová příprava veřejných úseků či jejich modernizace.	
G	G.1	I.G.1.5	Prodloužení a rozšíření vstavek a přístavků dráhy mezinárodního veřejného civilního letiště Karlovy Vary	KVK	MD	MŽP, MZe, MMR, MPO	2019-2022	Iniciace	1. Vláda ČR ukládá ministerstvu životního prostředí poskytnout maximální souhlasné při procesu projednávání EIA a výroby podmínek při respektování zákona o environmentálnímu řízení a řízení ovlivňování schváleného procesu dokumentu EIA a záměru prodloužení a rozšíření vstavek a přístavků dráhy mezinárodního veřejného civilního letiště Karlovy Vary. 2. Vláda ČR ukládá ministerstvu zemědělství a obchodu provést možnost bezplatného převodu pozemků ve správu Lesů ČR, s. p., pro účely záměru prodloužení vstavek a přístavků dráhy mezinárodního veřejného civilního letiště Karlovy Vary. 3. Vláda ČR ukládá ministerstvu dopravy ve spolupráci s ministerstvem pro místní rozvoj, ministerstvem financí a ministerstvem zemědělství a obchodu, Nadat možnost financování regionálních letišť.	Projekt rozšíření a prodloužení vstavek a přístavků dráhy letiště Karlovy Vary získal v červenci 2021 souhlasné závazné stanovisko ze strany Ministerstva životního prostředí (EIA). V současné době se finalizuje materiál se zadávací dokumentací na výběr projektanta stavby, předpokládá schválení ze strany Rady KVK dojde k jednomu úseku, zahájení zednického řešení začátkem března. Ze strany Odboru investic KVK se stále jedná o prioritní kraje, odboru byla seřazena projektová příprava akce a započato schválení finančních prostředků z přebytku hospodaření kraje za rok 2021. Letiště Karlovy Vary, si o. bude dlele odborného konzultanta. (202022) Komentář: 01/2024 - Projektová dokumentace k rozšíření i prodloužení letištní dráhy je hotová. Bod 1 je akce již splněn. Bod 2 a Bod 3 je nutné provést o příslušných resortu.	

PIII	SC	Číslo opatření	Název opatření	Region	Gesce	Gesce +	Doba realizace	Aktuální fáze realizace daného opatření	Úkol/usnesení	Komentář k naplňování daného opatření	Komentáře resorty	Komentáře ostatní
A	A.1	II.A.1.1	Podpora rozvoje podnikatelských aktivit ve strukturálně postižených regionech prostřednictvím investic do nemovitého majetku (bonifitace výzev OPVK - Nemovitosti)	Nadregionální	MPO		2018-2023	Finalizace/Splněno	Vláda ČR ukládá: ministři průmyslu a obchodu a) připravit výzev programu Nemovitosti s bodovým zvýhodněním postižených regionů, b) zanalýzovat možnost financování programu ze zdrojů OP PIK v dalších letech.	Opatření se podařilo naplnit. Celkem bylo podpořeno 42 projektů ve výši cca 814 mil. Kč.		
A	A.2	II.A.2.1	Zvýšení hospodářského přínosu cestovního ruchu ve specifických lokalitách strukturálně postižených regionů	Nadregionální	MMR		2019-2023	Finalizace/Splněno	Vláda ČR ukládá: ministři pro místní rozvoj a) navrhnout možnost vzniku nového programu, popř. podprogramu v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech "Zvýšení hospodářského přínosu cestovního ruchu ve specifických lokalitách strukturálně postižených regionů" a s respektem k charakteru tohoto návrhu připravit a vyhlásit tento program / podprogram, b) uplatnit při přípravě návrhu rozpočtu na příslušné rozpočtové období finanční nároky sjaté s implementací tohoto opatření.	K realizaci opatření je potřeba iniciovat jednání i ve vztahu ke vznikající Strategii regionálního rozvoje a také změn v některých dotáčních titulcích ze strany MMR tak, aby akcentovali obsah tohoto opatření. Zrealizované schůzky na odbornou ČR - nastavená spolupráce při identifikaci integrovaných projektů pro identifikaci vhodných zdrojů financování ESIF - kombinací a nové připravovaným národním OP pro oblast ČR. Komentář 2024 MMR: odložen cestovního ruchu/ Stávající národní program podpory cestovního ruchu v regionech umozňuje realizaci projektů zaměřených na rozvoj základní a dopravní infrastruktury cestovního ruchu - realizované projekty připravují k rozvoji potenciálu cestovního ruchu v regionech i zvýšení konkurenceschopnosti regionů jako destinací cestovního ruchu. Program je realizován na principu reprezentace, to znamená, že schůzka programu je rozložena mezi jednotlivé kraje. Každý kraj, má tak v podstatě stanovenou vlastní oblasti. Navíc projekty realizované na území strukturálně postižených regionů, respektive NROÚ jsou v rámci hodnocení bodově zvýhodňují. S ohledem na realizaci programu na principu reprezentace tak není nutné vytvářet samostatné podprogramy či programy pro podporu strukturálně postižených krajů. V návaznosti na průběhné vyhodnocení uzavřených výzev lze konstatovat, že dostupná finanční alokace je dostačující. Respektive celkové čerpání zátěže nedosahuje dostatečnou výši alokace pro daný kraj. Součástí disponibilní alokace pro kraj 2017-2020 (výjevy) V mil. Kč:Objevn skutečné čerpání dotace na kraj 2017-2020 (RoPD) V mil. Kč:Čerpání dotace na alokaci % KVK3,822,4616,11 MSK37,7420,4254,87 ÚSTK67,3613,6623,81 Jedním z důvodů pro nižší čerpání v rámci NPPCRR je i dostupnost jiných dotáčních zdrojů financovaných např. z prostředků EU (programy přeshraniční spolupráce Interreg, OP ST atd.). Výskyt krajských oblastí se podílí i do nové připravovaných dotační podpory ČR pro období po roce 2023. S ohledem na stávající nastavení NPPCRR i dosavadní vývoj čerpání krajských oblastí není vytváření samostatných podprogramů / programů na podporu rozvoje ČR v hospodářsky postižených regionech nutné.		
B	B.2	II.B.2.1	Příprava programu zaměřeného na regenerace specifických bowendů ve městech a obcích směřující k jejich dalšímu ekonomickému využití - Aktualizováno v APS	Nadregionální	MMR	MPO, MZP, MZe	2020-2024		Vláda ČR ukládá: ministři pro místní rozvoj ve spolupráci s ministři průmyslu a obchodu, ministrem životního prostředí a ministrem zemědělství a) zúčastnit se program MMR podporující studie využití specifických bowendů, b) připravit s ohledem na kompetence dotčených resortů dotační programy pro kraje, nebo obce, které budou zaměřeny na podporu komplexní regenerace specifických bowendů na podkladě studie a neovládání plánů.	Prohlášení připravená jednání směřující k nastavení základních kritérií definující tento typ bowendů jako vstupních parametrů pro přípravu daného programu a směřující k řešení otázek veřejné podpory. Využití se zkloubnosti z běžického DT na zpracování studií proveditelnosti a jejich přenesení do přípravy nového programového období, kde se předpokládá podpora tohoto typu BF v rámci OPST a také NPO.		
C	C.2	II.C.2.2	Podpora vědecko-popularizačních činností na území strukturálně postižených krajů	Nadregionální	MŠMT		2018-2026	Rozpracováno	Vláda ČR ukládá: ministři školství, mládeže a tělovýchovy a) provést rozličné úpravy programu THETA Technologické agentury ČR tak, aby umožnil vyhlášení regionálně specifických veřejných soutěží pro zaplnění realizace opatření podle bodu II. materiálu	Předpoklad řešení opatření z úrovně Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. - uvažovaný dvě varianty řešení zpracování analýzy: 1) odstranění varianty, která by v sobě zahrnovala mj. i průlom mezi relevantními stakeholdery na území (případně Ústeckého a Karlovarského kraje a byla by tak schopna relevantněji zrcadlit pocítovanou potřebu rozvoje činnosti charakteru „science“ center (horizont zpracování cca 6 měsíců). 2) ublí varianty, ve které by CSVS využilo primárně data z již realizovaných průzkumů / projektů a doplnila ji jen několika málo rozhovory s aktéry v území, analýza by byla v tomto případě omezena primárně na území Ústeckého kraje (horizont zpracování cca 3 měsíce). NVT RE START se kromě spolek k prvnímu zmíněnému řešení, které má potenciál přinést relevantnější a pro možný řešení dopad do praxe konkrétnější podoby. Varianta k řešení bude vybrána s ohledem na možnost promítnutí zjištění uvedených v analýze v kontextu dotáčních možností příslušného programového období, podrobně OP JAK.		
C	C.2	II.C.2.3	Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THETA - Aktualizováno v APS	Nadregionální	TA ČR		2019-2025	Finalizace/Splněno	Vláda ukládá: státní agentura Technologické agentury ČR a) provést rozličné úpravy programu THETA Technologické agentury ČR tak, aby umožnil vyhlášení regionálně specifických veřejných soutěží pro zaplnění realizace opatření podle bodu II. materiálu	Program THETA - byla ukončena 3. veřejná soutěž 24. 10. 2019 - 19. 12. 2019. Probíhá hodnocení. Celková alokace 735 mil. Kč. Obsahovala samostatnou alokaci 58,8 mil. Kč pro strukturálně postižené regiony. Program THETA - v roce 2018 byla ukončena 3. veřejná soutěž. Dále byla vyhlášena v roce 2021 již 4. veřejná soutěž, ve které bylo podpořeno 12 projektů ze strukturálně postižených regionů. S TAČR vylepšen jednotný postup pro VS programů TAČR - stanovení % na specifickou alokaci pro strukturálně postižené regiony v každé VS v členění 50:50 mezi NUTS II (hlavní uchazeč z ÚK, KVK a MSK). Postup se vypočítá i pro programy administrativně TA ČR. 5. VS - probíhá hlída pro poslední náhradu (č.č. - 27.7.2022), specifická alokace pro ÚK, MSK a KVK v celkové výši 58,8 mil. Kč pro návrhy projektů, ve kterých bude mít hlavní uchazeč sídlo v jednom ze tří krajů a které budou doporučené k podpoře. 4. VS - specifická alokace pro ÚK, MSK a KVK v celkové výši 51,6 mil. Kč, podpořeno celkem projekty ve VS: ÚK - 4, KVK - 2, MSK - 9. Přidělená dotace celkem 113 525 373,-Kč, z alokace RESTART 48 240 142,- Kč. 3. VS - samostatná alokace pro ÚK, MSK a KVK v celkové výši 58,8 mil., počet podpořených projektů celkem 7. Přidělená dotace celkem 162 mil. Kč. Komentář II. 2024: V roce 2022 byla vyhlášena 4. veřejná soutěž, podpořeny projekty ve výši přes 86 mil. Kč.		
D	D.2	II.D.2.1	Rozvoj multislužbových center celoživotního učení	Nadregionální	MŠMT	MPO, MK	2018-2030	Rozpracování	Vláda ČR ukládá: ministři školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s ministři průmyslu a obchodu a ministrem kultury a) provést rozličné úpravy programu THETA Technologické agentury ČR tak, aby umožnil vyhlášení regionálně specifických veřejných soutěží pro zaplnění realizace opatření podle bodu II. materiálu	Se zástupci MŠMT je naplňování opatření koordinováno. Do přehledu opatření byl aktivně zapojen Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s ním proběhlo vyhodnocení dosavadní činnosti tzv. center celoživotního učení v jednotlivých krajích - společně byly zároveň definovány rozvojové možnosti, které by do budoucna mohly přispívat k posílení činnosti center celoživotního učení, resp. multislužbových center celoživotního učení. Tyto rozvojové možnosti budou na začátku r. 2023 vyhodnoceny a prověřeny budou iniciativy konkrétního kraje na úrovni centrálních orgánů a současně v rámci jednotlivých regionů. Rozvoj center podpořuje v MSK už současný projekt KAP II, který pomáhá středním školám, aby se staly Centry excellence, byl převážně pro počáteční vzdělávání. Naplnění cíle se ale váže zejména na nové programové období, kdy takové centra budou vznikat a podporu OP a finds obnovy. V MSK také významně přispěje projekt Trautlorn - kompetence pro 21. století, který vytvoří ekosystém pro celoživotní vzdělávání a podpoří vznik center u několika vzdělávacích institucí.		
E	E.1	II.E.1.1	Podpora komunitního života a sociálních služeb - Aktualizováno v APS	Nadregionální	MMR	MPSV	2018-2020		Vláda ČR ukládá: ministři pro místní rozvoj a) zúčastnit se program MMR podporující studie využití specifických bowendů, b) připravit s ohledem na kompetence dotčených resortů dotační programy pro kraje, nebo obce, které budou zaměřeny na podporu komplexní regenerace specifických bowendů na podkladě studie a neovládání plánů.	Toto opatření a jeho cíle neměly stávajícími opatřeními a ani pokračujícími výzevami v ROPu naplněny a jejich potřeba trval zejména v ÚK a KVK. Die aktuálních informací z ROPu již ve stávajícím programovém období nedojde k vyhlášení výzev z důvodu přeplnění kapacity ROPu. Celostátní Komentářů center není součástí návrhu ROP 2021 - 2027 a bude potřeba hledat jiné cesty podpory tohoto typu aktivit na území strukturálně postižených regionů.		
E	E.2	II.E.2.1	Podpora zdravotnictví ve strukturálně postižených regionech - obnova rozvoje materiálně-technické základny - část A	Nadregionální	MZ		2018-2021	Finalizace/Splněno	Vláda ČR ukládá: ministři zdravotnictví a) pokračovat v přípravě programu zaměřeného na podporu rozvoje a obnovy materiálně-technické základny regionální zdravotnictví se zohledněním potřeb strukturálně postižených regionů, b) provést rozličné úpravy programu THETA Technologické agentury ČR tak, aby umožnil vyhlášení regionálně specifických veřejných soutěží pro zaplnění realizace opatření podle bodu II. materiálu	MZ spolupracovalo a průběžně spolupracuje s MMR (operační programy financované z EU fondů) na vyhlášení výzev ROP 2014-2020 a 2021-2027. Nastal REACTEU v rámci integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020, který reaguje na pandemii covid-19, umozní získat krajským i okresním nemocnicím (zejména urgentních příjmů i a II. typu) dotace v řádu stamilionů (např. Karlovarská krajská nemocnice a.s. - Karlovy Vary, Krajská zdravotní a.s. - Mladá Boleslav, nemocnice v L. a F. Fakultní nemocnice Olomoucký územní zdravotní ústav v 500 mil. Kč, urgentní příjmy II. typu (I. věšina okresních nemocnic) až 150 mil. Kč. Tyto rozsáhlé projekty jsou nyní v realizaci a měly by být dokončeny do konce roku 2023. V rámci ROP 2021-2027 se připravují do podpory výstavby a modernizace urgentních příjmů.		
E	E.2	II.E.2.2	Podpora zdravotnictví ve strukturálně postižených regionech - Systémové změny směřující k zaplnění kvalifikovaného zdravotnického personálu - část B	Nadregionální	MZ		2018-2019	Finalizace/Splněno	Vláda ČR ukládá: ministři zdravotnictví a) připravit návrh změny financování zdravotnictví za účelem udržení zdravotní péče v menších atrakčních lokalitách.	Projekty zaměřené na digitalizaci zdravotnictví jsou uvedeny na portálu Národního centra elektronického zdravotnictví - viz záložky Projekty a Národní plán obnovy.		
E	E.2	II.E.2.3	Podpora integrace zahraničních pracovníků - Aktualizováno v APS	Nadregionální	MV	MPSV	2019		Vláda ČR ukládá: ministři vnitra a ministři průmyslu a obchodu a) zúčastnit se program MMR podporující studie využití specifických bowendů, b) připravit s ohledem na kompetence dotčených resortů dotační programy pro kraje, nebo obce, které budou zaměřeny na podporu komplexní regenerace specifických bowendů na podkladě studie a neovládání plánů.	V souvislosti s invazí Ruská federace na Ukrajinu a s tím spojeným příchozem osob s dočasnou ochranou je toto opatření nerelevantní.		

F	F.2	I.F.2.1	Odpadové hospodářství Aktualizováno v AP6	Radegománě	SLŽP		2018-2026	Vláda ČR ukládá: ministru životního prostředí a) k 31. 12. 2018 vytvořit návrh plánu podpory výrobců z odpadů a finanční nástroj ke kompenzaci, v případě, že pořizovatel výrobků vyžaduje vynaložení vyšších finančních prostředků než cena zpracovaných výrobků z primárních surovin a to zejména u těch komodit, které jsou na trhu s ohledem na aktuální situaci obtížně uplatnitelné. b) k 31. 12. 2018 vytvořit finanční nástroj k podpoře vzniku zařízení k materiálovému využití odpadů, včetně vybudování nezbytné infrastruktury, síle obkladacích stanic, logistických center, třídících linek aj., kdy podmínky programu budou zohledňovat tzv. Bautek obhospodářství a také analýzy kapacity v dotčených regionech a jejich příslušné okolí. c) určitelní vznik nového zákona o odpadech, zejména aktualizace ekonomické složky, k podpoře nevykládacího průmyslu a stanovit jasná pravidla pro výrobu TAP. d) uplatnit při přípravě návrhu rozpočtu na příslušné rozpočtové období finanční nároky spojené s implementací tohoto opatření.	Naplnění opatření odráží nová legislativa odpadového hospodářství (zákon o odpadech č. 541/2020 Sb., zákon o výrobcích a ukončenou životností č. 542/2020 Sb. a novela zákona o obalech č. 543/2020 Sb.), která je v účinnosti od 1. 1. 2021 a zásadně podporuje přechod na obhospodářství a rovněž nový zákon o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí (v účinnosti od 1.10.2022) a aktualizovaný Plánu odpadového hospodářství ČR pro období 2018-2024 a výhledem do roku 2035 (POH ČR). Významná finanční podpora recyklace ze strany MŽP dlouhodobě plyne z programů: OPŽP 2014-2020, prioritní osy 2 „Opatření a materiálové toky, ekologické záležitosti a rizika“. OPŽP 2021-2027, v rámci Specifického cíle 1.5 – Podpora přechodu na obhospodářství účinně využívající zdroje. OPŽP 2021-2027 je připravena dotační podpora pro celou oblast odpadového a obhospodářství. Celková alokace na podporu přechodu na obhospodářství je na programové období OPŽP 2021-2027 cca 7,1 mld. Kč. V rámci OPŽP 2021-2027 rovněž připravuje MŽP ve spolupráci se SPŽP plánu podpory rozvoje infrastruktury odpadového hospodářství připravující a vyvíjí pozitivně na produktech z recyklovaných materiálů a zároveň k využití plastového odpadu vznikajícího v České republice prostřednictvím jednotlivých výzev OPŽP 2021-2027 a zvýšení recyklování produktů v tzv. „zelených“ výrobních řádcích. OPST 2021-2027, podpora přechodu na obhospodářství zaměřená přímo pro Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj. V OPST 2021-2027 jsou aktuálně vyhlášeny tři výzvy na podporu inovativních projektů obhospodářství a celková alokace 1,34 mld. Kč. Národní plán obnovy (NPO), Komponenta 2.7 cirkulární ekonomika, recyklace a průmyslová voda. Alokační prostředků na podporu je 1,6 mld. Kč.		
G	G.1	I.G.1.2	Systémový přístup k plánování služeb související s kamionovou dopravou	ÚK	MD	MMR, MPO	2019-2020	Vláda ČR ukládá: ministru dopravy a) Zohlednit v návaznosti na připravovanou koncepci opoček 2017-2032 zpracovanou ze strany ŘSD potřeby Ústeckého kraje, b) Provést analýzu stávající legislativy a v případě potřeby legislativně upravit stání mimo nezaplněné kapacity opoček při čerpání povinných přestávek. Termín do konce roku 2019 ministru dopravy ve spolupráci s ministrem průmyslu a obchodu a ministrem pro místní rozvoj. c) Provést analýzu dotačních možností podpory krajů a obcí a dalších subjektů při řešení chybných kapacit parkování a souvisejících služeb na území dotčených regionů a navrhnout nové či případnou úpravu stávajících dotačních programů umožňující subvencím v rozmezí tuto problematiku účinně řešit do 30. 6. 2019.	OPŽP 2014-2020, prioritní osy 3 „Opatření a materiálové toky, ekologické záležitosti a rizika“.		
G	G.1	I.G.1.3	Napojení Podkrkonošské výspě u Sokolova na veřejnou dopravní infrastrukturu v Karlovarském kraji z důvodu umožnění její revitalizace	KVK	MD		2018-2019	Vláda ČR doporučuje: a) hejmanu Karlovarského kraje zpracovat řešení způsobu napojení Podkrkonošské výspě u Sokolova ze silnice II/210 a připravit jej k předložení vládě ČR do 31. 12. 2018. Vláda ČR ukládá ministru dopravy b) je součinností s hejmanem Karlovarského kraje předložit k projednání vládě ČR řešení způsobu napojení Podkrkonošské výspě u Sokolova na základě podkladů zpracovaných Karlovarským krajem. c) uplatnit při přípravě návrhu rozpočtu na příslušné rozpočtové období finanční nároky spojené s implementací tohoto opatření.	Dané opatření se podařilo naplnit a příprava realizace dále probíhá. Dodávka k zahájení stavby dne 19. 9. 2019. Nepůhli nabídku podala společnost Strabag s cenou 73,7 mil Kč a OPV. Naplnění byla pouze první fáze, na schválení financí pro fázi druhou se čeká - předpoklad schválení jaro 2022 OPŽP 2021-2027, v rámci Specifického cíle 1.5 – Podpora přechodu na obhospodářství účinně využívající zdroje. OPŽP 2021-2027 je připravena dotační podpora pro celou oblast odpadového a obhospodářství. Celková alokace na podporu přechodu na obhospodářství je na programové období OPŽP 2021-2027 cca 7,1 mld. Kč.		
G	G.2	I.G.2.1	Chytlivost Městočinnosti kraj – ICT infrastruktura pro 21. století Aktualizováno v AP4	MSK	MPO		2018-2023	Vláda ČR ukládá: ministru průmyslu a obchodu a) vyčlenit prostředky pro výstavbu infrastruktury vysokorychlostní, bezpečné a bezdrátové sítě připojící k síti organizace, organizace veřejné správy a složky IZS k zajištění elektronické správy služeb.	Ze strany MSK a NVT probíhají přípravná jednání a resorty. S ohledem na další podněty z regionu NVT doporučuje aktualizaci tohoto opatření v rozšíření dopadu do všech tří strukturalně postižených krajů a také o další související aktivity viz potřeby ze statusu dat pro AP4. Pro období s regiony na základě nových potřeb je opatření aktualizováno v návrhu AP4 - Aktualizace v AP4 - I.G.2.1		

Výčet opatření, která lze označit za splněná, částečně splněná či v probíhající realizaci

Číslo	Název opatření
I.A.3.1	Podprogram programu TREND pro strukturálně postižené kraje
I.B.1.3	Návrh komplexního projektu propojujícího v Ústeckém a Karlovarském kraji těžbu lithia a doprovodných kovů na ložisku Klínovec
I.B.2.1	Program na regeneraci a podnikatelské využití brownfieldů vč. navýšení alokace tohoto programu
I.C.1.1	Program zaměřený na podporu bilaterální spolupráce v aplikovaném výzkumu, včetně podpory přeshraničních projektů (Program DELTA2 – přímá návaznost na program DELTA)
I.C.1.2	Program zaměřený na podporu technologického transferu, který by mohl do budoucna podporovat propojování lokálních inovativních MSP s výzkumnými organizacemi (Program GAMA2 – přímá návaznost na program GAMA)
I.C.1.3	Podpora bilaterální a multilaterální spolupráce v aplikovaném výzkumu (program EPSILON)
I.C.1.9	Vytvoření Národní inovační platformy pro chemii (NIP VIII. Chemie)
I.C.2.1	Program na podporu aplikovaného společenského a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (program ÉTA)
I.C.2.3	Program získávání expertů pro krajskou VaV excelenci
I.C.2.5	Testování autonomních silničních vozidel v reálném (nebo téměř reálném) silničním provozu města Ústí nad Labem – U "SMART" ZONE
I.D.1.1	Komplexní opatření „Regionální talent management“ – zvýšení atraktivity krajů pro život obyvatel a rozšíření nabídky perspektivních pracovních a kariérních vyhlídek pro mladé a kvalifikované odborníky
I.D.1.3	Cílené komplementární výzvy z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro VŠ ve strukturálně postižených regionech
I.D.2.1	Komplex opatření rozvíjející kariérové poradenství a celoživotní vzdělávání v krajích
I.D.2.2	Program „Yes, I do“ – zlepšení komunikace v anglickém jazyce u absolventů základních a středních škol
I.D.2.3	Program zaměřený na přípravu zaměstnanců pro moderní průmyslové firmy (vzdělávání 4.0 a práce 4.0 pro průmysl 4.0)
I.D.2.4	Rozvoj predikčního systému trhu práce prostřednictvím projektu KOMPAS
I.D.2.5	Realizace projektů PIPS (Podpora informačních a poradenských středisek) a EFES (efektivní služby zaměstnanosti)
I.D.2.6	Intenzivní využívání NSP v činnosti ÚP ČR (zprostředkování, poradenství, rekvalifikace)
I.D.2.7	V souladu se zákonnými postupy při zadávání veřejných zakázek bude ÚP ČR při výběru dodavatelů poradenských služeb akceptovat nabídky a aktivně oslovovat řemeslné inkubátory
I.D.2.8	Intenzifikace využití zvolené rekvalifikace – cílené využívání ustanovení § 109a Zákona o zaměstnanosti
I.D.2.9	Zpracování analýzy možnosti zavedení podpory v rekvalifikaci i v případě § 109a Zákona o zaměstnanosti
I.D.2.10	Realizace stávajících preventivních opatření v MSK a vyhodnocení jejich účinnosti na cílovou skupinu
I.D.2.11	Zpracování analýzy možnosti vytvoření nových či přizpůsobení stávajících nástrojů podporujících přizpůsobení podniků a jejich zaměstnanců technologickým změnám v prostředí 4. průmyslové revoluce při zachování maximální možné míry zaměstnanosti



I.D.3.1	Program „Krok za krokem na trh práce“ – rozvoj zaměstnatelnosti dlouhodobě nezaměstnaných osob
I.D.3.3	Zajistit plnění Usnesení vlády ČR č. 1127/2016
I.D.3.4	Realizace opatření k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti
I.D.3.5	Vzájemná spolupráce a koordinovaný přístup k dlouhodobě nezaměstnaným, zejména osobám v hmotné nouzi, v rámci útvarů ÚP ČR s cílem komplexně řešit situaci uchazečů o zaměstnání
I.D.3.6	Realizovat a průběžně vyhodnocovat příspěvek na podporu regionální mobility
I.E.1.1	Komplex opatření k řešení problematiky zadlužení jako jedné z příčin dlouhodobé nezaměstnanosti
I.E.1.2	Komplex opatření k posílení a zefektivnění činnosti ÚP ČR ve strukturálně postižených krajích
I.E.1.4	Analýza potenciálu stříbrné ekonomiky pro rozvoj Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje
I.E.2.3	Rozvoj zdravotnické infrastruktury – Karlovy Vary
I.E.4.1	Připravit regionální programy na podporu dalšího rozvoje již existujících místních kulturních institucí (muzea, divadla, orchestry, kulturní festivaly atd.) a na podporu vzniku nových kulturních institucí a aktivit ve všech třech krajích
I.F.1.3	Připravit návrh programu revitalizace / resocializace již dříve rekultivovaných ploch a území po těžbě
I.F.1.5	Akcelerace a urychlení čerpání alokace programu na řešení ekologických škod dle Usnesení vlády ČR č. 50/2002 Sb. na území Ústeckého a Karlovarského kraje
I.F.1.6	Podpora programu Revitalizace Krušných hor (Ústecký a Karlovarský kraj)
I.F.1.7	Akcelerace a urychlení čerpání alokace programu na řešení ekologických škod dle Usnesení vlády ČR č. 592/2002 Sb. na území Moravskoslezského kraje
I.F.2.1	Zhodnocení a případná úprava podmínek programu Demolice v sociálně vyloučených lokalitách vč. navýšení alokace tohoto programu
I.F.2.2	Vznik programu zaměřeného na regeneraci brownfieldů v intravilánech měst a obcí s cílem jeho prostřednictvím podporovat nepodnikatelské využití regenerovaných ploch (kompetence MMR)
I.F.2.3	Integrovaný Projekt celkové úpravy a využití prostor východního nádraží v Děčíně a budovy rakouské dráhy v jeho rámci
I.F.2.4	Analýza rozvojových příležitostí a výsledů dosavadních rozvojových projektů města Terezín
I.G.1.1	Komplex opatření k dobudování významných dopravních úseků – dálnic a silnic I. třídy
I.G.1.3	Komplex opatření ke zkapacitnění a modernizaci železničních tratí
II.A.1.1	Podpora rozvoje podnikatelských aktivit ve strukturálně postižených regionech prostřednictvím investic do nemovitého majetku (bonifikace výzev OPPIK - Nemovitosti)
II.A.2.1	Zvýšení hospodářského přínosu cestovního ruchu ve specifických lokalitách strukturálně postižených regionů
II.C.2.2	Podpora vědecko-popularizačních činností na území strukturálně postižených krajů
II.C.2.3	Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THETA
II.D.2.1	Rozvoj multislužbových center celoživotního učení
II.E.2.1	Podpora zdravotnictví ve strukturálně postižených regionech – obnova rozvoje materiálně-technické základny – část A
II.E.2.2	Podpora zdravotnictví ve strukturálně postižených regionech – Systémové změny směřující k zajištění kvalifikovaného zdravotnického personálu – část B
II.F.1.1	Zlepšit kvalitu ovzduší
II.F.1.3	Bezpečné kraje
II.F.1.4	Adaptace území na dopady změny klimatu
II.G.1.2	Systémový přístup k plánování služeb související s kamionovou dopravou
II.G.1.3	Napojení Podkrušnohorské výsypky u Sokolova na veřejnou dopravní infrastrukturu v Karlovarském kraji z důvodu umožnění její revitalizace
III.B.2.1	Finanční nástroj JESSICA II. pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

III.B.2.2	Program na zajištění nabídky průmyslových ploch typu greenfield a zlepšování kvality a využitelnosti stávajících průmyslových zón
III.C.2.2	Podpora vysoce kvalifikovaných lidských zdrojů pro MSK, ÚK a KVK
III.C.2.4	Podpora VaV infrastruktury
III.D.1.1	Financování provozu regionálních pracovišť veřejných vysokých škol na území Karlovarského a Ústeckého kraje
III.E.2.1	Podpora rozvoje Integrovaného záchranného systému
III.F.2.2	Specifické brownfieldy pro přípravu studií využitelnosti
III.G.1.1	Dopravní napojení strategického významu ve strukturálně postižených regionech
IV.A.3.1	Podpora digitalizace a robotizace především malých a středních firem prostřednictvím outsourcovaných služeb výzkumu, vývoje a poradenství
IV.D.2.1	Podpora modernizace výuky a obnovy a rozvoje materiálně-technického zázemí škol a školských zařízení
IV.E.4.1	Změna image strukturálně postižených regionů
IV.E.4.2	Podpora kulturních a kreativních odvětví
IV.F.1.1	Zpracování technickoekonomických analýz využitelnosti důlních děl v MSK
IV.F.2.1	Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách – pokračování DT
IV.F.2.2	Specifické brownfieldy pro přípravu studií využitelnosti
IV.F.2.3	Program na podporu občanské vybavenosti a obslužnosti obcí ve strukturálně postižených regionech
IV.F.3.1	Podpora komunitní energetiky ve strukturálně postižených regionech
IV.F.3.2	Podpora zřízení Center veřejných energetiků
IV.F.3.3	Fond na přípravu strategických projektů do Fondu pro spravedlivou transformaci
IV.G.1.1	Obnovení Slavkovské dráhy – studie proveditelnosti
IV.G.2.1	Podpora rozvoje digitalizace státní správy a samosprávy, digitalizace služeb pro občany regionu
V.A.1.1	Podpora rozvoje podnikatelských aktivit ve strukturálně postižených regionech prostřednictvím investic do nemovitého majetku
V.A.1.2	Program na podporu modernizace technologií firem
V.A.2.1	Podnikavý region (PODREG) – program na podporu začínajících podnikatelů či potenciálních podnikatelských záměrů
V.B.2.1	Příprava programu zaměřeného na regeneraci specifických brownfieldů směřujících k jejich dalšímu efektivnímu využití
V.C.1.1	Specifická podpora aplikovaného výzkumu a inovací pro strukturálně postižené regiony v rámci programu SIGMA
V.C.2.1	Specifická podpora výzkumu ve strukturálně postižených regionech
V.D.2.1	Komplex opatření rozvíjející kariérové poradenství, kariérové vzdělávání a příprav na zaměstnání v kontextu výzev spojených s transformací regionů
V.D.3.1	Komplexní opatření zaměřené na podporu tzv. tranzitních sociálních podniků
V.E.1.1	Podpora komunitního života
V.E.2.2	Podpora integrace zahraničních pracovníků
V.E.3.1	Komplexní obnova sídlišť (Specifická podpora bydlení a bytové politiky)
V.E.4.1	Podpora živého umění, kulturních a kreativních odvětví ve strukturálně postižených krajích
V.F.1.1	Přenastavení a posílení programu na sanaci ekologických škod financovaného z úrovně OP ŽP určeného pro města a obce – závazky nad rámec privatizačních smluv (kompetence MŽP)
V.F.1.2	Adaptace území na dopady změny klimatu
V.F.2.1	Přechod k oběhovému hospodářství



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Indikátory

Jedním ze způsobů, jak je sledována účinnost jednotlivých opatření akčních plánů, je využití tzv. **indikátorů**. Část z nich je definována přímo v konkrétním Akčním plánu (dále jen „AP“), ale využity jsou i další ukazatele, které vyplývají z jednotlivých projektů a dotačních programů a jsou tak lépe sledovatelné. Níže uváděné hodnoty vycházejí z projektů již realizovaných, kde jsou známa konkrétní data. Řada dalších projektů se nachází v procesu realizace či u nich data zatím nejsou k dispozici. Hodnoty jsou tak průběžně aktualizovány. Indikátory jsou vykazovány souhrnně i zvlášť za jednotlivé regiony (ÚK – Ústecký kraj, MSK – Moravskoslezský kraj a KVK – Karlovarský kraj) a vycházejí z projektů realizovaných z dotačních výzev vyhlašovaných od roku 2016.

1 Přehled výchozích projektů v číslech

Počet realizovaných/evidovaných projektů	342
- z toho: ÚK	147
MSK	151
KVK	44
Počet projektů ve fázi realizace*	274
- z toho: ÚK	120
MSK	101
KVK	53
Počet nerealizovaných projektů**	24
- z toho: ÚK	5
MSK	16
KVK	3
Počet projektů bez zpětné vazby od žadatele***	14
- z toho: ÚK	11
MSK	2
KVK	1

* projekty, ve fázi před realizací nebo ve fázi realizace, indikátory jsou průběžně doplňovány po realizaci projektů;

** přestože byla přidělena dotace, projekt nebyl žadatelem realizován a dotace nebyla čerpána: nejčastějším uváděným důvodem byly navýšené náklady v mezidobí schválení dotace a zahájení realizace projektu; situace s pandemií Covid19; změna finanční situace žadatele či realizace jiného projektu;

*** žadatel (zatím) neúspěšně osloven s žádostí o vyplnění základních informací do tzv. projektové karty; průběžný proces, který bude nadále pokračovat

2 Indikátory

V jednotlivých pilířích jsou uváděny indikátory, k již naplňovaným opatřením. V některých případech jsou indikátory rozděleny na výčet těch, které jsou k danému opatření uvedené v jednotlivých AP, ale zatím nejsou sledovány a na ty, ke kterým jsou v danou dobu dostupná data a je možno je evidovat.

Některé indikátory uvedené v AP vyjadřují dosažené výstupy, které v této fázi, kdy teprve projekty byly dokončeny, není ještě možné hodnotit. Vyjadřují dopady, které jsou souhrnné a mají dlouhodobější



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

charakter. Z toho důvodu jsou k nim aktuálně sledovány a uváděny přímé a konkrétní ukazatele jako jsou velikosti ploch, počty podpořených osob (atp. dle charakteru opatření).

2.1 Pilíř A

II.A.1.1. – Podpora rozvoje podnikatelských aktivit ve strukturálně postižených regionech prostřednictvím investic do nemovitého majetku (bonifikace výzev OPPIK – Nemovitosti). Opatření je naplňováno realizací projektů z programu *NEMOVITOSTI – V. Výzva – Uhebné regiony*.

Indikátor z AP 2:

Počet podpořených MSP	42
- z toho: ÚK	17
MSK	15
KVK	10

Další sledovaných indikátor:

Rozšířené, zrekonstruované nebo nově vybudované kapacity bez záboru zemědělského půdního fondu (m²)	96 384,80
- z toho: ÚK	27 459,85
MSK	29 634,82
KVK	39 290,13

2.2 Pilíř B

I.B.2.1 - Program na regeneraci a podnikatelské využití brownfieldů vč. navýšení alokace tohoto programu. Opatření je naplňováno především realizací projektů z dotačního programu *Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů*.

Indikátory v AP1 (zatím nesledované¹)

- Celková výše následných investic realizovaných na podpořených územích a v rekonstruovaných podnikatelských objektech
- Počet vytvořených pracovních míst
- Obsazenost průmyslových ploch a nemovitostí

Hlavní sledovaný indikátor:

Velikost podpořeného území (revitalizovaná plocha) m²	64 144
- z toho: ÚK	46 704
MSK	11673
KVK	5767

2.3 Pilíř C

I.C.2.5. – Testování autonomních silničních vozidel v reálném (nebo téměř reálném) silničním provozu města Ústí nad Labem – U "SMART" ZONE. Opatření je naplněno přímo projektem U – Smart zone (možnosti testování autonomních vozidel v městském provozu), konkrétně zpracováním studie proveditelnosti, která byla financována z programu *Ministerstva dopravy ČR*.

¹ Viz vysvětlení v úvodu kapitoly Indikátory



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Indikátory v AP1

- Počet účastí podpořených výzkumných týmů realizovaných v programu Horizont 2020
- Podíl VaV činnosti, spolupráce a výsledků výzkumných organizací v specializačních doménách

Hlavní sledovaný indikátor:

Počet studií proveditelnosti **1**

Opatření naplněno, zafinancovaná analýza byla v 1.Q 2019 zveřejněna.

2.4 Pilíř D

I.D.1.3 Cílené komplementární výzvy z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání pro VŠ ve strukturálně postižených regionech. Opatření je naplňováno především realizací projektů z dotačního programu OP VVV, PO2, Výzva č. 02_18_059 - ERDF výzva pro vysoké školy – Strukturálně postižené regiony.

Hlavní sledované indikátory vyplývající z projektů jsou tyto:

Počet podpořených osob novou infrastrukturou/projektem	5 161
- z toho: ÚK	1 223
MSK	3 938
Počet nových/upravených studijních programů	26
- z toho: ÚK	13
MSK	13

Projekty zaměřené na zvýšení kvality a profilace vzdělávacích aktivit reagovaly na specifické potřeby trhu práce ve strukturálně postižených regionech vyžadující přenositelné kompetence, které budou zvyšovat kvalitní zaměstnatelnost absolventů VŠ. Bylo vytvořeno zázemí pro nově akreditované multidisciplinární studijní programy vycházejí z potřeb regionů a nové formy výukových metod posilující univerzity a vazbu mezi studenty a univerzitami.

I.D.3.4 Realizace opatření k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti. Opatření je naplňováno především realizací projektů z OP Z – výzva č. 90 Specifická výzva na vybrané cílové skupiny IP 1.1. Indikátory v AP1 (zatím nesledované²)

- Výrazné snížení počtu dlouhodobě nezaměstnaných (ve srovnat. letech dle celkového počtu nezaměstnaných)
- Snižování strukturální nerovnováhy mezi poptávkou a nabídkou po nízkokvalifikovaných profesích na trhu práce
- Počet a úspěšnost inovativních řešení k podpoře zaměstnanosti

Hlavní sledované indikátory:

Počet účastníků/podpořených osob	1 412
- z toho: ÚK	914
MSK	380
KVK	118
Účastníci se získanou kvalifikací/rekvalifikací	553
- z toho: ÚK	390
MSK	97
KVK	66

² Viz komentář v úvodu kapitoly indikátory



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V případě projektů „Plus pro práci“ a „Nová naděje“ byl nositelem žadatel z Karlovarského kraje, ale jelikož byly realizovány na území Ústeckého kraje, jsou právě do ÚK započítány výstupy z těchto projektů. Projekty se zpravidla zaměřovaly na snížení nezaměstnanosti dlouhodobě a opakovaně nezaměstnaných osob a zároveň osob s nízkou kvalifikací, dále jako komplexní nástroje pomoci cílové skupině osob pečujících o malé děti či zpřístupnění možnosti zaměstnání osobám se záznamem v Rejstříku trestů a jejich zapojení do pracovního procesu.

II.D.2.2 a III.D.2.1 Podpora modernizace výuky a obnovy a rozvoje materiálně-technického zázemí škol a školských zařízení – vyhlášení specifických výzev IROP pro strukturálně postižené regiony. Opatření je naplňováno realizací projektů z 92. Výzvy IROP – *Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony*.

Indikátory z AP (a zároveň sledované indikátory z projektů):

Počet podpořených škol	97
- z toho: ÚK	35
MSK	54
KVK	8
Kapacita podporovaných škol a školských zařízení	29 674
- z toho: ÚK	12 049
MSK	14 521
KVK	3 104
Počet vybavených laboratoří a odborných učeben	250
- z toho: ÚK	85
MSK	131
KVK	34

2.5 Pilíř E

II.E.2.1 Podpora zdravotnictví ve strukturálně postižených regionech – obnova rozvoje materiálně-technické základny – část A. Opatření je naplňováno realizací projektů z *Realokace IROP SC 2.3 „Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví“*. Hlavním cílem opatření však zůstává vytvoření dlouhodobého finančního zdroje, který umožní průběžně modernizovat materiálovou základnu krajského zdravotnictví, tedy i pomocných provozů těchto zařízení.

Indikátory z AP (a zároveň sledované indikátory z projektů):

Počet podpořených zdravotnických zařízení	16
- z toho: ÚK	6
MSK	10
Počet pořízených přístrojů a zařízení	1 457
- z toho: ÚK	604
MSK	853



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

2.6 Pilíř F

I.F.1.6 Podpora programu Revitalizace Krušných hor (Ústecký i Karlovarský kraj). Opatření je naplňováno přímo programem *Revitalizace Krušných hor*.

Indikátory z AP (a zároveň sledované indikátory z projektů):

Počty projektů revitalizace (především na přeměnu/výchovu náhradních dřevin) podaných jednotlivými kategoriemi žadatelů o dotaci (jednotky)	24
- z toho: ÚK	23
KVK	1
Plošný rozsah projektů revitalizace (především na přeměnu/výchovu náhradních dřevin) podaných jednotlivými kategoriemi žadatelů o dotaci (ha)	1 598
- z toho: ÚK	1 589,89
KVK	8,11

I.F.2.1 Zhodnocení a případná úprava podmínek programu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách. Opatření je naplňováno realizací projektů z podprogramu *Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách (Program revitalizace území, MMR)*.

Indikátory v AP1 (zatím nesledované³)

- Zvýšení objemu investic
- Zvýšení počtu nově vytvořených pracovních míst
- Zvýšení počtu návštěvníků a uživatelů a nabídky funkcí v prostorách a místech
- Snížení sociopatologických jevů

U většiny projektů na demolice se s výraznými investicemi na nově vzniklém prázdném prostoru nepočítá, obce tam nechávají volná prostranství, malé parčíky, případně vybudují dětské hřiště či nové parkovací plochy, kterých bývá nedostatek. Výrazně se tak zlepší i vzhled a bezpečnost revitalizované oblasti. Cílem většiny projektů bylo plnohodnotně připravit území tak, aby se dalo plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce a zamezit tím vzniku oblasti se sociální segregací.

Hlavní sledované indikátory:

Počet odstraněných objektů	68
- z toho: ÚK	40
MSK	14
KVK	14
Revitalizovaná plocha v m²	62 208
- z toho: ÚK	44 691
MSK	5 815
KVK	11 702

I.F.2.2 Vznik dotačního titulu zaměřeného na regeneraci brownfieldů v intravilánech obcí pro další nepodnikatelské využití revitalizovaných ploch. Toto opatření je naplňováno realizací projektů z podprogramu *Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití (Program revitalizace území, MMR)*.

Indikátory v AP1 (zatím nesledované⁴)

- Zvýšení objemu investic
- Zvýšení počtu nově vytvořených pracovních míst
- Zvýšení počtu návštěvníků a uživatelů a nabídky funkcí v prostorách a místech

³ Viz vysvětlení v úvodu kapitoly Indikátory



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- Snížení sociopatologických jevů

Hlavní sledované indikátory:

Počet rekonstruovaných/odstraněných objektů	33
- z toho: ÚK	9
MSK	9
KVK	15
Revitalizovaná plocha v m²	29 814,68
- z toho: ÚK	13 939,70
MSK	5 953,98
KVK	8 592,00
Obestavěný prostor odstraněného nebo rekonstruovaného objektu v m²	71 570,60
- z toho: ÚK	18 000,00
MSK	13 418,30
KVK	37 352,30

II.F.1.1 Zlepšit kvalitu ovzduší. Toto opatření je naplňováno rozmanitějšími typy projektů, jednak nákupy nízkoemisních a bezemisních vozidel (*Realokace IROP č.89 nízkoemisní vozidla a bezemisní vozidla pro uhelné regiony*), jednak také např. projekty realizovanými z 136. výzva OP ŽP (*Realokace*) – *Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek v uhelných regionech*.

Indikátor v AP2 (zatím nesledovaný⁴):

- Procento plochy území s překročenými imisními limity (tj. limity pro kvalitu ovzduší)

Sledováno je více dílčích indikátorů, mezi hlavní patří:

Počet všech stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, u kterých bylo provedeno opatření ke snížení emisí (OPŽP)	28
- z toho: ÚK	9
MSK	19
KVK	0
Počet pořízených nízkoemisních vozidel (IROP)	132
- z toho: ÚK	3
MSK	121
KVK	8

III.F.2.2 Specifické brownfieldy pro přípravu studií využitelnosti. Toto opatření je naplňováno realizací projektů z podprogramu *Tvorba studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů (Podpora revitalizace území, MMR)*. Realizace tohoto opatření, tj. tvorba daných studií, je předstupeň realizace opatření I.B.2.1, které by mohlo být alespoň z části naplněno v rámci Fondu pro spravedlivou transformaci nebo v rámci Národního plánu obnovy.

V AP k tomuto opatření žádné nadefinované indikátory nejsou. Relevantním indikátorem je:

Počet analýz/studií	10
- z toho: ÚK	5
MSK	3
KVK	2

⁴ Viz vysvětlení v úvodu kapitoly Indikátory



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Přehled podpořených specifických brownfieldů pro studie využitelnosti:

ÚK

- Lokalita Teplické nádraží
- Objekt bývalých Městských lázní v Chomutově
- Východní nádraží v Děčíně
- Město Terezín – Analýza rozvojových příležitostí města Terezín
- Město Žatec – Studie využití brownfieldu Dreherův Pivovar

MSK

- Dukelská kasárna – lokalita A
- Ostrava – Rozvojová plocha mezi Dolní oblastí Vítkovic a Karolinou
- Studie proveditelnosti – Bývalý areál vojenských kasáren ve Služovicích

KVK

- Areál bývalého ředitelství s.p. Statek Skalná
- Karlovy Vary – území staré Vodárny

2.7 Pilíř G

II.G.1.3. Napojení „Podkrušnohorské výsypky u Sokolova“ na veřejnou dopravní infrastrukturu v Karlovarském kraji z důvodu umožnění její revitalizace. Jedná se o regionální opatření a je naplňováno projektem II/210 Napojení Podkrušnohorské výsypky v k.ú. Horní Nivy financovaným ze *Státního fondu dopravní infrastruktury*.

V Akčním plánu k tomuto opatření indikátory definované nejsou. Evidujeme následující:

Okružní křižovatka na silnici II/210 počet	1
úprava silnice II/210 v m	626
dopravní napojení Podkrušnohorské výsypky – počet	1

Opatření, jak je nastaveno v AP2, je již úspěšně naplněno (I. etapa projektu, která zahrnovala výstavbu nové okružní křižovatky na silnici II/210 a vlastního dopravního propojení na Podkrušnohorskou výsypku, byla zrealizována v letech 2019 a 2020). Momentálně je navíc v řešení pokračování projektu. Je připravena další etapa projektu s názvem „III/21036 Okružní křižovatka pro napojení areálu BMW“, která zahrnuje výstavbu další okružní křižovatky již v lokalitě Podkrušnohorské výsypky. Tento projekt je připraven, stavební povolení je vydáno a je vysoutěžen zhotovitel stavby. Nyní se řeší zajištění potřebných finančních prostředků.

2.8 Ostatní sledované ukazatele

Napříč jednotlivými pilíři jdou opatření, v rámci kterých jsou zpracovány rozličné analýzy či studie. Ze všech dosavadních AP1–AP5 vychází z jednotlivých opatření tvorba různých analýz či studií.

Pro celkový přehled již zpracovaných studií, které zcela či částečně naplňují některá z opatření RE:START, je sledován i tento souhrnný indikátor.

Počet studií/analýz

12

Kromě již výše zmíněných studií v rámci opatření I.C.2.5. (1x) a III.F.2.2 (9x) se ještě jedná o následující:

- *Analýzy možnosti zavedení podpory v rekvalifikaci i v případě § 109a Zákona o zaměstnanosti*
- *Analýzy možnosti vytvoření nových či přizpůsobení stávajících nástrojů podporujících přizpůsobení podniků a jejich zaměstnanců technologickým změnám v prostředí 4. průmyslové revoluce při zachování maximální možné míry zaměstnanosti*



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

- *Analýza potenciálu stříbrné ekonomiky pro rozvoj Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje*

3 Závěr

Současné hodnoty indikátorů, jak bylo zmíněno v úvodu přílohy, jsou dány postupně získávanými daty a budou se dále vyvíjet. Ve snaze být v kontaktu s aktéry v území a docílit tak cenné zpětné vazby, která je potřebná i pro nastavování dotačních programů, jsou údaje získávány převážně přímým oslovením žadatelů. Alternativní formou je vyžádání souhrnných dat od poskytovatelů dotací.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR
